



**MINISTÈRE
DES ARMÉES
ET DES ANCIENS
COMBATTANTS**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Secrétariat général
pour l'administration**

Service d'infrastructure
de la Défense

Journée d'information aux entreprises 2026



Programmation achats SID Nord-Est

Retrouvez ici les projets d'achats du SID Nord-Est :

- Par entité (unité de soutien, bureau de conduite d'opération ou de maîtrise d'œuvre, sous-direction) et secteur géographique

- Pour la période allant de 2026 à 2029

- Par catégorie de marché et par classe de coût (HT) :
 - A = < à 500 k€
 - B = 500 k€ à 1 M€
 - C = 1 à 3 M€
 - D = 3 à 7 M€
 - E = 7 à 10 M€
 - F = 10 à 15 M€
 - G = > à 15M€


Sous-direction MAINTENANCE ET PATRIMOINE



Achats à portée régionale



Maintenance et petits travaux

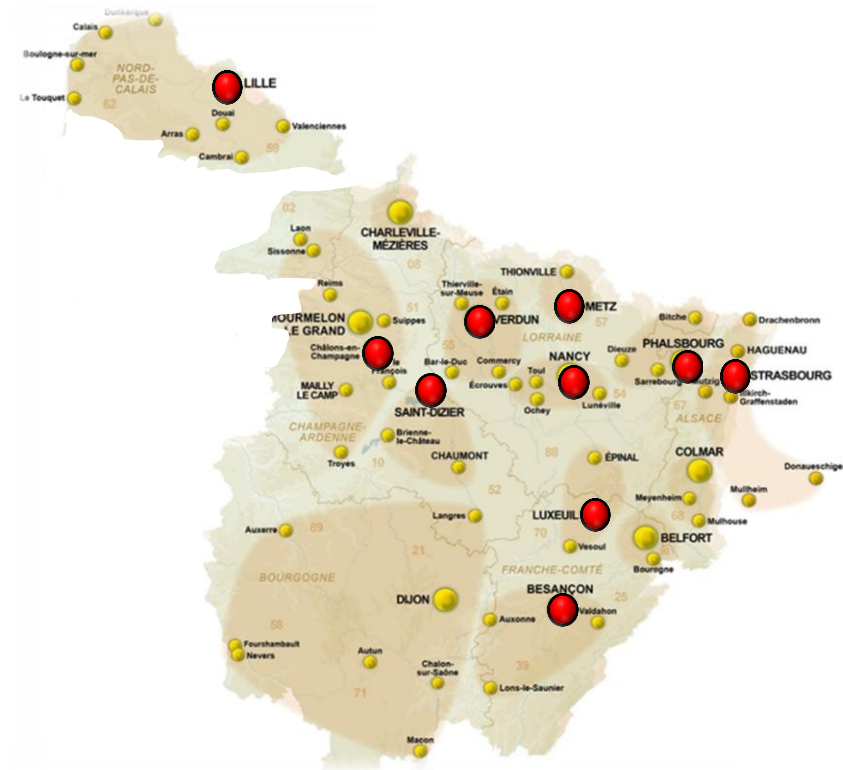

AC BC pour la maintenance des onduleurs, baie 48 V, redresseurs et convertisseurs au profit des sites dépendant du SID NE

Points clés :

- ✓ Classe de coût E : 7 à 10 M€
- ✓ Contrat de fournitures et services
- ✓ Accord cadre massifié à bons de commande – multi lots
- ✓ Procédure ouverte
- ✓ Maitrise d'œuvre interne



Contact : USID de Saint Dizier
IMI DIVO - leo.divo@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 2^{ème} trimestre 2026
- ✓ Date de notification : 4^{ème} trimestre 2026
- ✓ Durée globale d'exécution : 48 mois (1 an reconductible 3 fois)

AC BC pour la maintenance des systèmes de sécurité incendie au profit des sites dépendant du SID NE

Points clés :

- ✓ Classe de coût G : > 15 M€
- ✓ Contrat de fournitures et services
- ✓ Accord cadre massifié à bons de commande – multi lots
- ✓ Procédure ouverte
- ✓ Maitrise d'œuvre interne



Contact : USID de Luxeuil

M. VELOSO DA SILVA - arnaud.veloso-da-silva@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 2^{ème} trimestre 2026
- ✓ Date de notification : 4^{ème} trimestre 2026
- ✓ Durée globale d'exécution : 48 mois (1 an reconductible 3 fois)

AC BC pour la maintenance des portes et portails au profit des sites dépendant du SID NE

Points clés :

- ✓ Classe de coût G : > 15 M€
- ✓ Contrat de fournitures et services
- ✓ Accord cadre massifié à bons de commande – multi lots
- ✓ Procédure ouverte
- ✓ Maitrise d'œuvre interne



Contact : USID de Metz

M. MISLER - yves.misler@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 2^{ème} trimestre 2026
- ✓ Date de notification : 4^{ème} trimestre 2026
- ✓ Durée globale d'exécution : 48 mois (1 an reconductible 3 fois)

AC BC pour la maintenance des compresseurs et centrales d'air comprimé au profit des sites dépendant du SID NE

Points clés :

- ✓ Classe de coût D : 3 à 7M€
- ✓ Contrat de fournitures et services
- ✓ Accord cadre massifié à bons de commande – multi lots
- ✓ Procédure ouverte
- ✓ Maitrise d'œuvre interne



Contact : USID de Phalsbourg

M. BRESSANNUTI - diego.bressannutti@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 2^{ème} trimestre 2026
- ✓ Date de notification : 4^{ème} trimestre 2026
- ✓ Durée globale d'exécution : 48 mois (1 an reconductible 3 fois)

AC BC pour la maintenance des appareils de levage au profit des sites dépendant du SID NE

Points clés :

- ✓ Classe de coût D : 3 à 7M€
- ✓ Contrat de fournitures et services
- ✓ Accord cadre massifié à bons de commande – multi lots
- ✓ Procédure ouverte
- ✓ Maitrise d'œuvre interne



Contact : USID de Verdun
M. CARY - cyril.cary@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 4^{ème} trimestre 2026
- ✓ Date de notification : 2^{ème} trimestre 2027
- ✓ Durée globale d'exécution : 48 mois (1 an reconductible 3 fois)

AC Travaux Tous Corps d'Etat bâtementaire, VRD, Couverture au profit des sites dépendant du SID NE

Points clés :

- ✓ Classe de coût G : > 15 M€
- ✓ Contrat de travaux
- ✓ Accord cadre massifié à bons de commande et marchés subséquents – multi lots
- ✓ Procédure restreinte
- ✓ Maitrise d'œuvre interne



Contact : SID NE / SD MP

M. FOUCRE - georges-alexandre.foucre@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication phase candidature : début 2^{ème} trimestre 2026
- ✓ Date de publication phase offre 3^{ème} trimestre 2026
- ✓ Date de notification : 1^{er} trimestre 2027
- ✓ Durée globale d'exécution : 48 mois (1 an reconductible 3 fois)

Les Unités de Soutien d'Infrastructure de la Défense (USID)

- Besançon
- Châlons-en-Champagne
- Lille
- Luxeuil
- Metz
- Nancy
- Phalsbourg
- Saint-Dizier
- Strasbourg-Haguenau-Colmar
- Verdun

USID Besançon



VALDAHON (25) Camp d'instruction – Stand de Tir - Réfection de l'étanchéité toiture terrasse

Points clés :

- ✓ Classe de coût C = 1 à 3 M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ MAPA ouvert
- ✓ Maîtrise d'œuvre interne



Contact :

USID BESANCON – Section Exploitation de la Maintenance

M. Florent AUDIFFREN, conducteur d'opération : florent.audiffren@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 3^{ème} trimestre 2026
- ✓ Date de notification : 4^{ème} trimestre 2026
- ✓ Durée globale d'exécution : 8 mois (PP comprise)

BESANCON (25) – Quartier Brun

Réhabilitation du bâtiment 87 et des sanitaires du « H » (bâtiments 72,73 et 74)

Points clés :

- ✓ Classe de coût C = 1 à 3 M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ MAPA ouvert – Procédure allotie
- ✓ Maîtrise d'œuvre interne

- ✓ Bâtiment 87 de 536 m²
- ✓ Extension prévue



Contact :

USID BESANCON – Section Exploitation de la Maintenance
Mme Indira ZERIC, conducteur d'opération : indira.zeric@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 2^{ème} trimestre 2026
- ✓ Date de notification : 3^{ème} trimestre 2026
- ✓ Durée globale d'exécution : 9 mois (PP comprise)

BESANCON (25) – Quartier Brun Rénovation de la salle Menguéné

Points clés :

- ✓ Classe de coût A ≤ 500 k€
- ✓ Réhabilitation avec mise aux normes ERP (incendie / accessibilité)
- ✓ Aménagements intérieurs
- ✓ Travaux sur MEXT et façade
- ✓ Rampe et accès PMR
- ✓ MAPA ouvert – procédure allotie
- ✓ Maîtrise d'œuvre interne



Contact : USID de BESANCON – Section Travaux
usid-besancon-como.contact.fct@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 1^{er} semestre 2026
- ✓ Date de notification : 2^{ème} semestre 2026
- ✓ Durée globale d'exécution : 6 mois hors PP de 3 mois

CHALON SUR SAONE (71) – Casernes Carnot et Moreteaux Installation de groupes électrogènes

Points clés :

- ✓ Classe de coût A ≤ 500 k€
- ✓ Installation d'un groupe électrogène pour chaque caserne et des cuves à carburant nécessaire.
- ✓ Maitrise d'œuvre interne
- ✓ MAPA ouvert



Contact : USID de BESANCON – Section Travaux
usid-besancon-como.contact.fct@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 1^{er} semestre 2027
- ✓ Date de notification : 2^{ème} semestre 2027
- ✓ Durée globale d'exécution : 5 mois hors 6 mois PP

VALDAHON (25) – Camp de passage Aménagement d'un bâtiment en salle multisports

Points clés :

- ✓ Classe de coût C = 1 à 3 M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ MAPA ouvert – procédure allotie : Electricité / Menuiseries intérieures et extérieures / Gros-œuvre / Plâtrerie – isolation et aménagement / Peintures et revêtements / Plomberie et CVC
- ✓ Maîtrise d'œuvre interne



Contact : USID de BESANCON – Section Travaux
usid-besancon-como.contact.fct@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 1^{er} trimestre 2027
- ✓ Date de notification : 3^{ème} trimestre 2027
- ✓ Durée globale d'exécution : 9 mois hors 3 mois PP

USID Châlons-en-Champagne



SUIPPES (51) – CAPCIA – 51°RI

Réhabilitation de 7 ponts du camp de Suippes

Points clés :

- ✓ Classe de coût C = 1 à 3 M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Procédure ouverte
- ✓ Conduite d'opération interne

Les travaux consistent à la réhabilitation de 7 ponts.
Les ponts seront soit détruits puis reconstruits ou rénovés.



Contact :

USID CHALONS – M. CHAUMELLE, conducteur d'opération – cyrille.chaumelle@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 2^{ème} trimestre 2027
- ✓ Date de notification : 3^{ème} trimestre 2027
- ✓ Durée globale d'exécution : 5 à 13 semaines en fonction des ponts = 21 mois de travaux répartis sur 3 ans

USID Lille



DOUAI (59) – 41 RT - Remplacement de la couverture et isolation bât. 052

Points clés :

- ✓ Classe de coût B : 500k€ - 1M€
- ✓ Marché de travaux : 3 lots (couverture – second œuvre - électricité)
- ✓ Marché à procédure adaptée
- ✓ Maitrise d'œuvre interne

- Surface : 1500 m²
- Dépose de la couverture existante, rénovation et isolation, compris petits travaux intérieurs et alimentation énergie.
- Contrainte réglementaire : Désamiantage



Contact :

USID de LILLE

Mr MIAADI – SEM - abdelkader.miaadi@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel

- ✓ Date de publication : T3 - 2026
- ✓ Date de notification : T4 – 2026
- ✓ Durée globale d'exécution : 5 mois


USID Luxeuil



EPINAL (88) - Caserne Varaigne Création d'une piste tout-terrain VBCI

- ✓ Classe de coûts A = < à 500k€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Procédure ouverte
- ✓ Maîtrise d'œuvre interne

14 obstacles seront disséminés le long de la piste afin de reproduire différentes situations que pourraient rencontrer les pilotes.

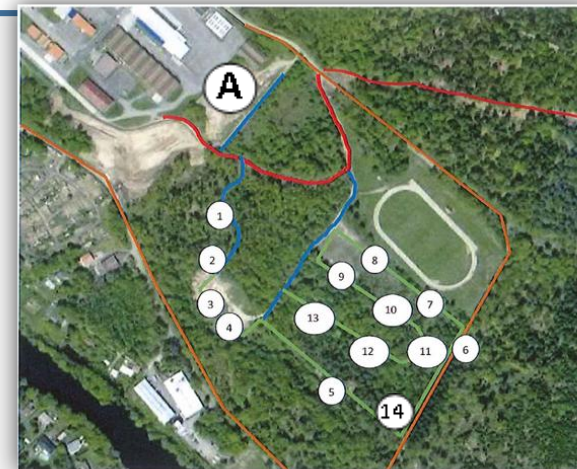


Contact :

USID LUXEUIL- Monsieur HOUILLON : olivier.houillon@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 2^{ème} trimestre 2027
- ✓ Date de notification : 3^{ème} trimestre 2027
- ✓ Durée globale d'exécution : 5 mois

USID Metz

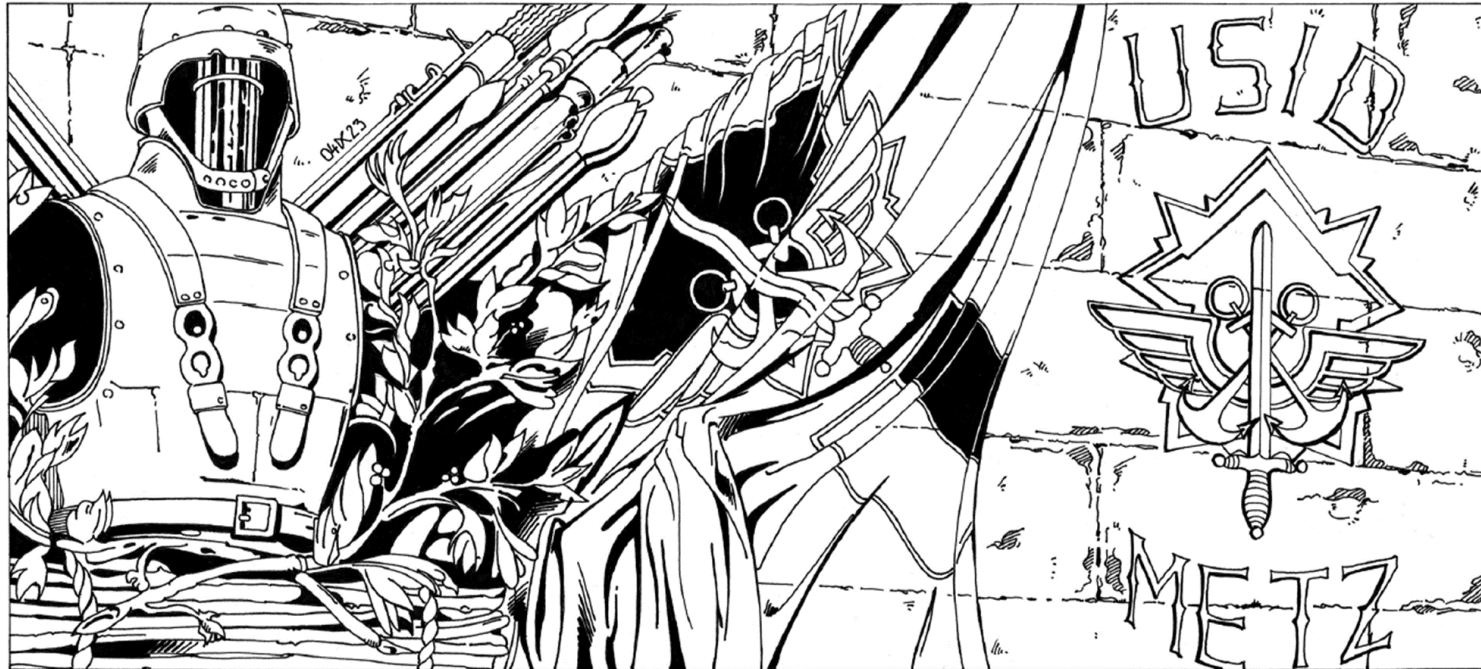

METZ (57) – HRIA LEGOUEST

BAT 0049 – Installation de l'échelon de commandement du CMA zonal Est

Points clés :

- ✓ Classe de coût C : de 1 à 3M€
- ✓ MAPA Travaux TCE
- ✓ Procédure ouverte
- ✓ Maîtrise d'œuvre interne

Dans un ERP 4^e catégorie type U : Transformation d'une aile d'un bâtiment sur 2 niveaux type chambre d'hôpital en bureaux, avec sanitaires PMR



Contact :

USID METZ – M. LARTIGAU Richard, Chef de la Section Travaux - richard.lartigau@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 3^e trimestre 2026
- ✓ Date de notification : 1^{er} trimestre 2027
- ✓ Durée globale d'exécution : 6 mois

METZ (57) – Caserne De Lattre de Tassigny Remplacement de la station énergie (GE)

Points clés :

- ✓ Classe de coût C = entre 1 et 3 M€
- ✓ Marché global sectoriel (CCAEM ou Conception Réalisation) - Travaux
- ✓ Procédure restreinte
- ✓ Marché de défense et de sécurité (Marché sensible)
- ✓ Conduite d'opération interne



Contact :

USID METZ – M. LARTIGAU Richard, Chef de la Section Travaux - richard.lartigau@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 4^e trimestre 2026 (candidature)
- ✓ Date de notification : 2^e semestre 2027
- ✓ Durée globale d'exécution : 24 mois (tranche ferme)

WOIPPY (57) – DET 6^e RMAT SCORPION Etape 2

Points clés :

- ✓ Classe de coût B : entre 500k€ et 1M€
- ✓ MAPA Travaux en allotissement
- ✓ Procédure ouverte
- ✓ Maîtrise d'œuvre interne

Adaptation de 4 travées de maintenance NTI pour accueillir les véhicules SCORPION (Bornes, portes de hangar...) sur 2 bâtiments



Contact :

USID METZ – M. LARTIGAU Richard, Chef de la Section Travaux - richard.lartigau@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 1^e semestre 2028
- ✓ Date de notification : 2^e semestre 2028
- ✓ Durée globale d'exécution : 6 mois

USID Nancy




Cartographie des Opérations de 2026 à 2029



CHENEVIÈRES (54) - Casernement LASALLE - 53^e RT Bâtiment 052 - Location chaufferie mobile

Points clés :

- ✓ Classe de coûts A = < 500 k€
- ✓ Accord-cadre FCS
- ✓ Conduite d'opération et maîtrise d'œuvre internes
- ✓ Amenée, installation et maintenance d'une chaudière mobile, avec service d'astreinte

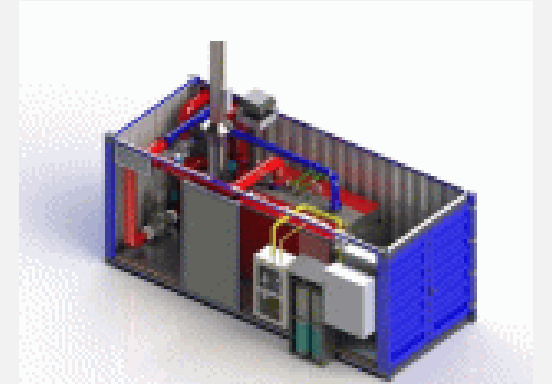

Contact :

USID Nancy – M. KREMER, chef antenne Lunéville - usid-nancy-antenne-luneville.contact.fct@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 2^e trimestre 2026
- ✓ Date de notification : 3^e trimestre 2026
- ✓ Durée globale d'exécution : 4 ans maximum

LUNEVILLE (54) - Stand de tir du Riannois - 53^e RT Caractérisation des sols + dépollution

Points clés :

- ✓ Classe de coûts A = < 500 k€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Conduite d'opération et maîtrise d'œuvre internes
- ✓ Diagnostic pollution et dépollution du stand de tir



Contact :

USID Nancy – M. KREMER, chef antenne Lunéville - usid-nancy-antenne-luneville.contact.fct@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 1^{er} semestre 2026
- ✓ Date de notification : 2^e semestre 2026
- ✓ Durée globale d'exécution : 5 mois (hors PP)

ÉCROUVES (54) - Quartier Fabvier - 516^e RT Bâtiment 022 - 3^e étage - Réfection des blocs douches et sanitaires

Points clés :

- ✓ Classe de coûts A = < 500 k€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Conduite d'opération et maîtrise d'œuvre internes
- ✓ Sanitaires et douches vétustes, réfection complète, parois en panneaux stratifiés



Contact :

USID Nancy – Mme HERGOTT, adjointe au chef antenne Ecrouves - usid-nancy-antenne-ecrouves.contact.fct@intradef.gouv.fr


Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 3^e trimestre 2026
- ✓ Date de notification : 4^e trimestre 2026
- ✓ Durée globale d'exécution : 3 mois (hors PP)

ÉCROUVES (54) - Quartier La Justice BCC 001 - Rénovation complète des blocs sanitaires

Points clés :

- ✓ Classe de coûts A = < 500 k€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Conduite d'opération et maîtrise d'œuvre internes
- ✓ Sanitaires et douches vétustes, réfection complète, parois en panneaux stratifiés

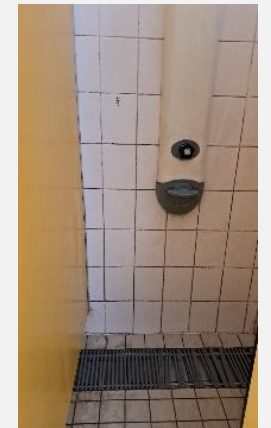

Contact :

USID Nancy – Mme HERGOTT, adjointe au chef antenne Ecrouves - usid-nancy-antenne-ecrouves.contact.fct@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 2^e trimestre 2026
- ✓ Date de notification : 3^e trimestre 2026
- ✓ Durée globale d'exécution : 3 mois (hors PP)

ÉCROUVES (54) - Quartier Fabvier Réfection du réseau AEP

Points clés :

- ✓ Classe de coûts B = 500 k€ à 1M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Conduite d'opération et maîtrise d'œuvre internes
- ✓ Reprise des réseaux AEP extérieurs du quartier



Contact :

USID Nancy – Mme HERGOTT, adjointe au chef antenne Ecrouves - usid-nancy-antenne-ecrouves.contact.fct@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 1^{er} semestre 2029
- ✓ Date de notification : 2^e semestre 2029
- ✓ Durée globale d'exécution : 10 mois (hors PP)

ÉCROUVES (54) - Stand de tir La Justice Réfection de l'étanchéité de la toiture-terrasse

Points clés :

- ✓ Classe de coûts B = 500 k€ à 1M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Conduite d'opération et maîtrise d'œuvre internes
- ✓ Reprise totale de la couverture du stand de tir



Contact :

USID Nancy – M. VILLEMAIN, conducteur de travaux – usid-nancy-section-travaux.contact.fct@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :


- ✓ Date de publication : 1^{er} semestre 2027
- ✓ Date de notification : 2^e semestre 2027
- ✓ Durée globale d'exécution : 5 mois (hors PP)

NANCY (54) - Caserne THIRY - CLEO/CSTA

Remise en état du mur d'enceinte côté Pépinière et remplacement du concertina

Points clés :

- ✓ Classe de coûts A = < 500 k€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Conduite d'opération et maîtrise d'œuvre internes
- ✓ Traitement de l'humidité, consolidation structure et reprise totale de l'enduit d'un mur de pierre sur 150 mètres linéaires et 5 mètres de haut



Contact :

USID Nancy – M. MARTIN, chef antenne Nancy - usid-nancy-antenne-nancy.contact.fct@intradef.gouv.fr


Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 2^e trimestre 2026
- ✓ Date de notification : 4^e trimestre 2026
- ✓ Durée globale d'exécution : 4 mois (hors PP)

OCHEY (54) - BA133 - PC BASE Bâtiment 0142 - Rénovation des sanitaires du 1^{er} et 2^e étages

Points clés :

- ✓ Classe de coûts A = < 500 k€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Conduite d'opération et maîtrise d'œuvre internes
- ✓ Sanitaires et douches vétustes, réfection complète, parois en panneaux stratifiés

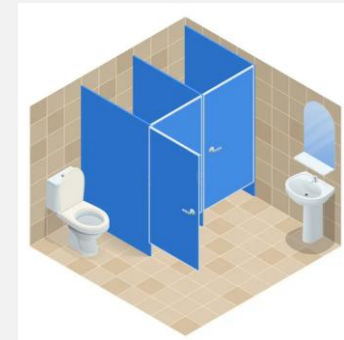

Contact :

USID Nancy – IMI SOLA, chef antenne Ochey - usid-nancy-antenne-ochey.contact.fct@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 2^e trimestre 2026
- ✓ Date de notification : 3^e trimestre 2026
- ✓ Durée globale d'exécution : 3 mois (hors PP)

OCHEY (54) - BA133 - Extérieur Réfections de 3 km de clôture (3 tranches)

Points clés :

- ✓ Classe de coûts C = 1 à 3 M€
- ✓ Marché de travaux – à tranches (1 ferme / 2 optionnelles)
- ✓ Conduite d'opération et maîtrise d'œuvre internes
- ✓ Remplacement de clôtures existantes, à l'identique, sur plusieurs zones au sein de la BA



Contact :

USID Nancy – IMI SOLA, chef antenne Occhey - usid-nancy-antenne-occhey.contact.fct@intradef.gouv.fr


Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 2^e ou 3^e trimestre 2026
- ✓ Date de notification : 4^e trimestre 2026
- ✓ Durée globale d'exécution : 5 mois (hors PP) pour la tranche ferme

OCHEY (54) - Base aérienne 133 Réfection et isolation de la toiture du bâtiment HM7

Points clés :

- ✓ Classe de coût C = 1 à 3 M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Conduite d'opération et maîtrise d'œuvre interne
- ✓ Surface ~ 3 000 m²



Contact :

USID Nancy – M. RONSTALDER, conducteur de travaux – usid-nancy-section-travaux.contact.fct@intradef.gouv.fr


Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 3^e trimestre 2026
- ✓ Date de notification : 4^e trimestre 2026
- ✓ Durée globale d'exécution : 24 mois

OCHEY (54) - Base aérienne 133 Réfection et isolation de la toiture du bâtiment HM6

Points clés :

- ✓ Classe de coût C = 1 à 3 M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Conduite d'opération et maîtrise d'œuvre interne
- ✓ Surface ~ 4 000 m²



Contact :

USID Nancy – M. RONSTALDER, conducteur de travaux – usid-nancy-section-travaux.contact.fct@intradef.gouv.fr


Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 3^e trimestre 2026
- ✓ Date de notification : 4^e trimestre 2026
- ✓ Durée globale d'exécution : 24 mois

OCHEY (54) - Base aérienne 133 Réfection salle de décontamination HM1

Points clés :

- ✓ Classe de coûts A < 500 k€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Conduite d'opération et maîtrise d'œuvre internes



Contact :

USID Nancy – M. RONSTALDER, conducteur de travaux – usid-nancy-section-travaux.contact.fct@intradef.gouv.fr


Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 3^e trimestre 2026
- ✓ Date de notification : 4^e trimestre 2026
- ✓ Durée globale d'exécution : 8 mois

OCHEY (54) - Base aérienne 133 CHENIL - Création d'un parc de détente

Points clés :

- ✓ Classe de coûts A < 500 k€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Conduite d'opération et maîtrise d'œuvre internes



Contact :

USID Nancy – Mme DAVELUY, chef de la section travaux – usid-nancy-section-travaux.contact.fct@intradef.gouv.fr


Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 4^e trimestre 2026
- ✓ Date de notification : 1^{er} trimestre 2027
- ✓ Durée globale d'exécution : 6 mois

OCHEY (54) - Base aérienne 133 Création d'un stand de tir ouvert évolutif (STOE)

Points clés :

- ✓ Classe de coûts A < 500 k€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Conduite d'opération et maîtrise d'œuvre internes



Contact :

USID Nancy – M. VILLEMAIN, conducteur de travaux – usid-nancy-section-travaux.contact.fct@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 1^{er} semestre 2027
- ✓ Date de notification : 2^e semestre 2027
- ✓ Durée globale d'exécution : 5 mois (hors PP)

USID Phalsbourg



BITCHE (57) – CAMP – 16BCP – Rénovation du bat 412 (Plan famille)

Points clés :

- ✓ Classe de coût B : 500k€ - 1M€
- ✓ Marché de travaux alloti
- ✓ Marché à procédure adaptée
- ✓ Maitrise d'œuvre interne

- Surface : 600 m²
- Réhabilitation de l'ancien foyer du camp en vue de création d'une maison des familles
- Contrainte réglementaire : Mise aux normes ERP



Contact :

USID de Phalsbourg/section travaux

LTN HOTZ Alexandre – alexandre.hotz@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : T2 - 2026
- ✓ Date de notification : T4 - 2026
- ✓ Durée globale d'exécution : 8 mois

SARREBOURG (57) – 1RI - Q.TIVOLI – BAT 10 – Rénovation de la Maison des familles de Picardie

Points clés :

- ✓ Classe de coût B : 500k€ - 1M€
- ✓ Marché de travaux alloti
- ✓ Marché à procédure adaptée
- ✓ Maitrise d'œuvre interne

- Réfection de la toiture
- Remplacement des menuiseries extérieures
- Travaux en secteur protégé ABF



Contact :

USID de Phalsbourg/Antenne de Sarrebourg

Mme WILL – chargée de projet - segolene.will@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : T2 - 2026
- ✓ Date de notification : T4 - 2026
- ✓ Durée globale d'exécution : 6 mois

BOURSCHEID (57) – Q. LA HORIE – Antenne médicale – Bat 004 – Reprise de la façade et du couvert

Points clés :

- ✓ Classe de coût C : 1 à 3 M€
- ✓ Marché de travaux alloti
- ✓ Marché à procédure adaptée
- ✓ Maitrise d'œuvre interne

- Surface : 1500 m²
- Réhabilitation de l'enveloppe extérieure (couverture + ITE)
- Travaux de désamiantage nécessaires avant intervention sur la couverture



Contact :

USID de Phalsbourg/section travaux

LTN HOTZ Alexandre – alexandre.hotz@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :


- ✓ Date de publication : T1 - 2027
- ✓ Date de notification : T3 - 2027
- ✓ Durée globale d'exécution : 12 mois

BOURSCHEID (57) – Q. LA HORIE – 1RHC – Hangar 066 – Réalisation d'une isolation thermique

Points clés :

- ✓ Classe de coût C : 1 à 3M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Marché à procédure adaptée
- ✓ Maitrise d'œuvre interne

- Surface 3300 m²
- Réhabilitation de l'enveloppe extérieure (couverture + ITE)
- Travaux de désamiantage nécessaire avant intervention sur la couverture



Contact :

USID de Phalsbourg/section travaux

LTN HOTZ Alexandre – alexandre.hotz@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :


- ✓ Date de publication : S2 - 2029
- ✓ Date de notification : S1 - 2030
- ✓ Durée globale d'exécution : 12 mois

USID de Saint-Dizier



L' USID

Chef de l'USID
IC2MI Laurent VERDIER

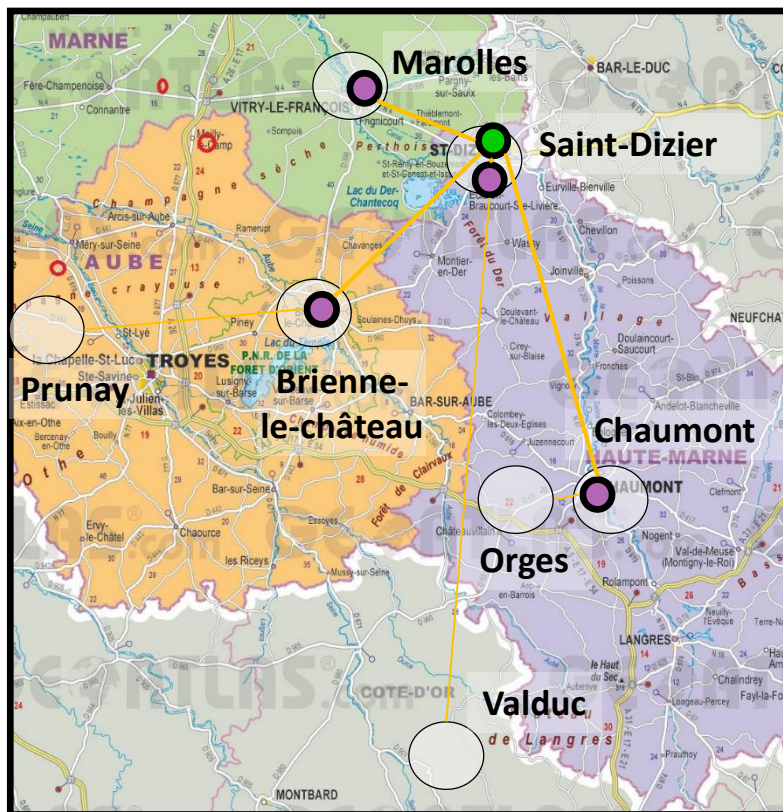

Portion centrale (Saint Dizier ●) et antennes (●) et emprises soutenus ○

LES MISSIONS

→ **Maintenir en condition les infrastructures**

- Maintenance préventive / corrective,
- Petites opérations d'investissement

→ **Conseiller en matière d'infrastructure**

- Pour l'expression des besoins
- Pour les schémas directeurs immobilier

→ **Gérer le patrimoine**

- Instruction et préparation des actes domaniaux ;
- Tenue à jour du référentiel technique

Hors MISSION

→ **les opérations d'investissement d'envergures**

SEMOUTIERS (52) – 61^e Régiment d'Artillerie Réaménagement du bâtiment 133 en maison des familles

Points clés :

- ✓ Classe de coût A : < à 500 k€
- ✓ Localisation: Quartier d'Aboville, proche de Chaumont
- ✓ Maîtrise d'œuvre: interne
- ✓ Dévolution: marché unique de travaux
- ✓ Réhabilitation intérieure et réaménagement pour création de deux appartements dans l'existant au profit des familles de militaires



Contact : USID SDZ

M. FUSILI – florent.fusili@intradef.gouv.fr

IMI BENEL – maximilien.benel@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Mise en publicité: 3^{ème} trimestre 2026
- ✓ Début des travaux: 1^{er} trimestre 2027
- ✓ Durée prévisionnelle: 3 à 5 mois

BRIENNE-LE-CHÂTEAU (10) – Etablissement Principal des Munitions Réfection des chemins de ronde

Points clés :

- ✓ Classe de coût C: 1 à 3 M€
- ✓ Localisation: Dépôt de Munitions de Brienne (10)
- ✓ Maîtrise d'œuvre: interne
- ✓ Dévolution: marché unique de travaux en tranches
- ✓ Reprise de la voirie et optimisation des tracés sur l'ensemble du périmètre du site pour la réfection des chemins de ronde



Contact : USID SDZ

M. FUSILI – 0351731243 – florent.fusili@intradef.gouv.fr

IMI BENEL – 0351731245 – maximilien.benel@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Mise en publicité: entre 2^{ème} et 3^{ème} trimestre 2026
- ✓ Début des travaux: 4^{ème} trimestre 2026
- ✓ Durée prévisionnelle: entre 4 et 7 mois, 4 mois pour la tranche ferme

USID Strasbourg-Haguenau-Colmar



STRASBOURG (67) – Corps Européen – Quartier Aubert de Vincelles Pose de stores textiles solaires

Points clés :

- ✓ Classe de coût A < 500k€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Marché public ouvert
- ✓ Conduite d'opération interne



Contact :

Section travaux - ADC Frédéric FORTUNÉ, conducteur de travaux - frederic.fortune@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 2^{ème} trimestre 2026
- ✓ Date de notification : 3^{ème} trimestre 2026
- ✓ Durée globale d'exécution : 3 mois

STRASBOURG (67) – Corps Européen – Quartier Aubert de Vincelles Réfection de toitures terrasses et pose de panneaux solaires

Points clés :

- ✓ Classe de coût C = 1 à 3 M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Marché public ouvert
- ✓ Conduite d'opération interne



- 4 bâtiments similaires
- Rénovation des toitures pour améliorer l'isolation
- Installation de panneaux solaires



Contact :

Section travaux - Monsieur Romain GRUBER, chargé d'affaires apprenti- romain.gruber@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 2^{ème} trimestre 2026
- ✓ Date de notification : 3^{ème} trimestre 2026
- ✓ Durée globale d'exécution : 6 mois

STRASBOURG (67) – Corps Européen – Quartier Lizé

Rénovation de la couverture et installation d'un ascenseur extérieur

Points clés :

- ✓ Classe de coût C = 1 à 3 M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Marché public ouvert
- ✓ Conduite d'opération interne

- Installation d'un ascenseur extérieur
- Rénovation de la couverture
- Mise aux normes incendie



Contact :

Section travaux - ADC Emmanuel LEROUX, conducteur de travaux - emmanuel.leroux@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 2^{ème} trimestre 2026
- ✓ Date de notification : 3^{ème} trimestre 2026
- ✓ Durée globale d'exécution : 8 mois

ILLKIRCH (67) – Centre médical allemand – Quartier Leclerc Aménagement d'un cabinet dentaire

Points clés :

- ✓ Classe de coût C = 1 à 3 M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Marché public ouvert
- ✓ Conduite d'opération interne

- Rénovation des locaux existants
- Création de salles de soins et de stockage médical



Contact :

Section travaux - ADC Frédéric FORTUNÉ, conducteur de travaux - frederic.fortune@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 3^{ème} trimestre 2026
- ✓ Date de notification : 1^{er} trimestre 2027
- ✓ Durée globale d'exécution : 5 mois

MEYENHEIM (68) – RMT– Quartier Dio

Réfection du clos couvert d'un hangar métallique

Points clés :

- ✓ Classe de coût B = 500k€ à 1M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Marché public ouvert
- ✓ Conduite d'opération interne

- Renforcement charpente métallique
- Réfection toiture et bardage métallique
- Remplacement des portes sectionnelles
- Mise aux normes incendie
- Création de sanitaires



Contact :

Section travaux - ADC Emmanuel LEROUX, conducteur de travaux - emmanuel.leroux@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 2^{ème} trimestre 2026
- ✓ Date de notification : 3^{ème} trimestre 2026
- ✓ Durée globale d'exécution : 8 mois



Opérations programmées pour 2027-2028

2027 :

- ✓ COLMAR (68) – 152RI – Création d'un hangar BICUB : classe de coût B (500k€ à 1M€)

2028 :

- ✓ COLMAR (68) – 152RI – Construction d'une maison des familles : classe de coût B (500k€ à 1M€)
- ✓ STRASBOURG (67) – CAN – Remise à niveau d'un centre Réseaux informatiques : classe de coût B (500k€ à 1M€)




Allemagne – FFECSA – Breisach, Schönwald et Müllheim – Marché CVC AC BC pour l'entretien et l'exploitation des install. de CVC au profit des FFECSA

Points clés :

- ✓ Classe de coût C = 1 à 3M€
- ✓ FCS Fournitures et services
- ✓ Marché USID
- ✓ Procédure ouverte
- ✓ Maitrise d'œuvre interne

AC BC pour l'entretien et l'exploitation des installations de chauffage collectif, de climatisation, de production d'eau chaude sanitaire et des VMC de Breisach, Schönwald et Müllheim (FFECSA Allemagne)



Contact USID-SHC – Section Exploitation Maintenance :

M. Jimmy HAMILCARO, chargé d'affaire - jimmy.hamilcaro@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 1^{er} trimestre 2026
- ✓ Date de notification : 3^{ème} trimestre 2026
- ✓ Durée globale d'exécution : 48 mois (12 mois + 3 x 12 mois)

Zone de compétence de l'USID de STRASBOURG-HAGUENAU-COLMAR

AC BC pour la réalisation de prestations de maintenance de chambres froides positives et négatives

Points clés :

- ✓ Classe de coût C = 1 à 3M€
- ✓ FCS Fournitures et services
- ✓ Marché USID
- ✓ Procédure ouverte
- ✓ Maitrise d'œuvre interne

AC BC pour la réalisation de prestations de maintenance préventive, corrective et améliorative au profit des installations de chambres froides positives et négatives des points de restaurations situées dans la zone de compétence de l'USID Strasbourg-Haguenau-Colmar



Contact USID-SHC – Section Exploitation Maintenance :

M. Jimmy HAMILCARO, chargé d'affaire - jimmy.hamilcaro@intradef.gouv.fr

M. Cilian BRUNBROUCK, apprenti - cilian.brunbrouck@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 2^{ème} trimestre 2027
- ✓ Date de notification : 3^{ème} trimestre 2027
- ✓ Durée globale d'exécution : 48 mois (12 mois + 3 x 12 mois)

USID Verdun



ROUVRES-EN-WOEVRES (55) - BASE ALAT E.MANTOUX Création d'une maison régimentaire (bâtiment 0016)

Points clés :

- ✓ Classe de coût C = 1 M€ à 3 M€
- ✓ Marché de travaux tous corps d'état
- ✓ Procédure ouverte
- ✓ Conduite d'opération interne

Rénovation du bâtiment :

- Création de bureaux ;
- Création de 1 à 2 logements ;
- Réalisation de locaux conviviaux.



Contact :

Section travaux USID Verdun – Monsieur DUFAYE, chef de section – loic.dufaye@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 3^e trimestre 2026
- ✓ Date de notification : 4^e trimestre 2026
- ✓ Durée globale d'exécution : 15 mois

ROUVRES-EN-WOEVRES (55) - BASE ALAT E.MANTOUX Rénovation du cinéma (bâtiment 0041)

Points clés :

- ✓ Classe de coût B = 500 k€ à 1 M€
- ✓ Marché de travaux alloti
- ✓ Procédure ouverte
- ✓ Conduite d'opération interne

- Réalisation de trois blocs sanitaires distincts (femmes, hommes et PMR) ;
- Réfection des sanitaires et des vestiaires dans les coulisses, création d'un local de stockage ;
- Réfection de la salle cinéma (sièges, sol et murs).



Contact :

Section travaux USID Verdun – Monsieur DUFAYE, chef de section – loic.dufaye@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 2^e trimestre 2026
- ✓ Date de notification : 3^e trimestre 2026
- ✓ Durée globale d'exécution : 6 mois

Sous-direction INVESTISSEMENT

- Les Bureaux de Conduite d'Opérations (BCO)
 - Besançon
 - Châlons-en-Champagne
 - Metz
 - Nancy
 - Strasbourg

Sous-direction Investissement Bureau de Conduite d'Opérations (BCO) de Besançon



VALDAHON (25) – 13^e régiment du génie Adaptation des champs de tir

Points clés :

- ✓ Classe de coût D = 3 à 7 M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Conduite d'opération interne
- ✓ Maîtrise d'oeuvre interne

- Travaux de terrassement et de nivellement
- Création de buttes de tir et de plateformes
- Création de fosses de tir



Contact :

BCO Besançon - Monsieur CHEVRAND Edouard, conducteur d'opérations - edouard.chevrant@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :


- ✓ Date de publication : Février 2028
- ✓ Date de notification : Août 2028
- ✓ Durée globale d'exécution : 32 mois

VALDAHON (25) – 13^e régiment du génie Construction d'un MASTTAC Combat embarqué - Rénovation des routes du village de combat

Points clés :

- ✓ Classe de coût C = 1 à 3 M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Conduite d'opération interne
- ✓ Maîtrise d'oeuvre interne

- Rénovation des routes du village de combat existantes
- Pose de containers faisant office de bâtiment
- Création de nouvelles routes

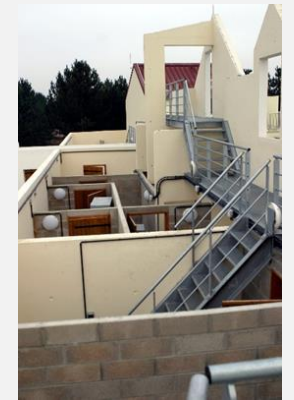

Contact :

BCO Besançon - Madame SAINT VOIRIN Nathalie, conductrice d'opérations - nathalie.saint voirin@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : Avril 2028
- ✓ Date de notification : Novembre 2028
- ✓ Durée globale d'exécution : 10 mois

BESANCON (25) – 6^e RMA Annexe Lyautey TRANSFORMATION DE L'ARMÉE DE TERRE

Points clés :

- ✓ Classe de coût G => 15 M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Marché global sectoriel (CCAEM)
- ✓ Procédure restreinte
- ✓ Conduite d'opération interne

- Déconstruction des réseaux et bâtiments de l'emprise
- Construction d'un poste de commandement
- Construction d'un Poste d'accueil et de filtrage
- Construction de deux bâtiments identitaires
- Construction d'une Armurerie
- Reconstruction des réseaux secs et humides
- Sécurisation de l'emprise
- Création de Parkings et place d'armes



Contact :

BCO Besançon - Monsieur LEU Sébastien, Adjoint chef de bureau - sebastien.leu@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : Mai 2026
- ✓ Date de notification : Décembre 2027
- ✓ Durée globale d'exécution : 60 mois

AUTUN (71) - Lycée militaire Construction d'un bâtiment cadres célibataires 20 places

Points clés :

- ✓ Classe de coût D = 3 à 7 M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Marché global sectoriel (CCAEM)
- ✓ Procédure restreinte
- ✓ Conduite d'opération interne

- Surface construite : 630 m²
- Construction en zone ABF
- Stationnement 20 places VL
- Chambres individuelles avec pièce d'eau et cuisinette



Contact :

BCO Besançon - Madame LIGIER Céline, conductrice d'opérations - celine.ligier@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : Mars 2027
- ✓ Date de notification : Juin 2028
- ✓ Durée globale d'exécution : conception 6 mois - réalisation 14 mois - maintenance 24 mois reconductible 2 fois

BOUROGNE (90) -1^{er} régiment d'artillerie Réhabilitation des bâtiments 014 et 015

Points clés :

- ✓ Classe de coût E = 7 à 10 M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Marché global de Performance (MGP)
- ✓ Procédure restreinte
- ✓ Conduite d'opération interne

- Réhabilitation lourde de deux bâtiments
- Réglementation thermique RE2020



Contact :

BCO Besançon - Madame LIGIER Céline, conductrice d'opérations - celine.ligier@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : juin 2027
- ✓ Date de notification : décembre 2028
- ✓ Durée globale d'exécution : 20 mois

Sous-direction INVESTISSEMENT Bureau de Conduite d'Opérations (BCO) de Châlons-en-Champagne



SUIPPES (51) – 132ème RIC Construction de 10 courettes témoin

Points clés :

- ✓ Classe de coûts B = 500 k€ à 1 M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Conduite d'opération interne
- ✓ Maîtrise d'œuvre interne



Contact :

BMO Châlons-en-Champagne – IMI FORT Arnaud, chef BMO - arnaud1.fort@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : T2 2026
- ✓ Date de notification : 2026
- ✓ Durée globale d'exécution : 12 mois

SUIPPES (51) – 132^{ème} RIC Construction d'un bâtiment cynotechnique

Points clés :

- ✓ Classe de coûts C = 1 M€ à 3 M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Conduite d'opération interne
- ✓ Maîtrise d'œuvre interne



Contact :

BMO Châlons-en-Champagne – IMI FORT Arnaud, chef BMO - arnaud1.fort@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 2^{ème} semestre 2027
- ✓ Date de notification : 2028
- ✓ Durée globale d'exécution : 14 mois

MOURMELON-LE-GRAND (51) – 501ème RCC Création atelier APC, optique, NBC

Points clés :

- ✓ Classe de coûts C = 1 M€ à 3 M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Conduite d'opération interne
- ✓ Maîtrise d'œuvre interne



Contact :

BMO Châlons-en-Champagne – IMI FORT Arnaud, chef BMO - arnaud1.fort@intradef.gouv.fr


Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : T4 2026
- ✓ Date de notification : 2026/2027
- ✓ Durée globale d'exécution : 8 mois

LILLE (59) – Caserne Boufflers Création d'une armurerie

Points clés :

- ✓ Classe de coûts C = 1 M€ à 3 M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Conduite d'opération interne
- ✓ Maîtrise d'œuvre interne

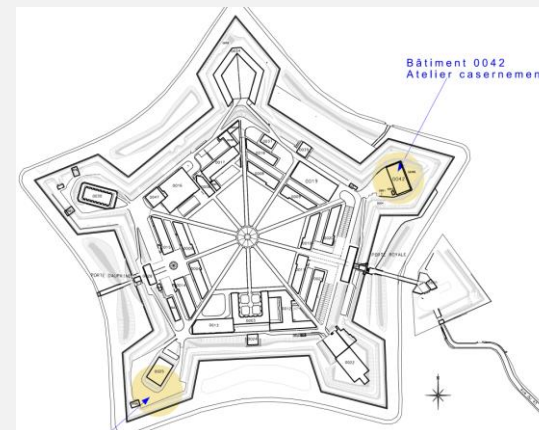

Contact :

BMO Châlons-en-Champagne – IMI FORT Arnaud, chef BMO - arnaud1.fort@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 2^{ème} semestre 2026
- ✓ Date de notification : 2027
- ✓ Durée globale d'exécution : 12 mois

DOUAI (59) – Quartier Corbineau Réhabilitation du bâtiment 010

Points clés :

- ✓ Classe de coûts C = 1 M€ à 3 M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Conduite d'opération interne
- ✓ Maîtrise d'œuvre interne



Contact :

BMO Châlons-en-Champagne – IMI FORT Arnaud, chef BMO - arnaud1.fort@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 2^{ème} semestre 2026
- ✓ Date de notification : 2027
- ✓ Durée globale d'exécution : 10 mois

MAILLY (10) – 5^{ème} RD Construction d'un espace tradition

Points clés :

- ✓ Classe de coûts B = 500 k€ à 1 M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Conduite d'opération interne
- ✓ Maîtrise d'œuvre interne



Contact :

BMO Châlons-en-Champagne – IMI FORT Arnaud, chef BMO - arnaud1.fort@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 2^{ème} semestre 2028
- ✓ Date de notification : 2029
- ✓ Durée globale d'exécution : 14 mois

MAROLLES (51) – ERSA Construction d'un PAF

Points clés :

- ✓ Classe de coûts B = 500 k€ à 1 M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Conduite d'opération interne
- ✓ Maîtrise d'œuvre interne



Contact :

BMO Châlons-en-Champagne – IMI FORT Arnaud, chef BMO - arnaud1.fort@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 2^{ème} semestre 2027
- ✓ Date de notification : 2028
- ✓ Durée globale d'exécution : 14 mois

Sous-direction INVESTISSEMENT Bureau de Conduite d'Opérations (BCO) de Metz



BITCHE Camp (57) - 16e BC

Rénovation des systèmes de production et distribution de chaleur et améliorations d'enveloppes thermiques

Points clés :

- ✓ Classe de coûts G = Sup à 15 M€
- ✓ Marché global sectoriel (CCAEM)
- ✓ Procédure restreinte
- ✓ Conduite d'opérations interne

- Reprise des réseaux de chaleur
- Travaux d'amélioration énergétique
- Suppression des chaudières fioul



Contact :

BCO Metz – IPMI Delphine GONDRAN, Cheffe de bureau – delphine.gondran@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : T2 2026
- ✓ Date de notification : 2^{ème} semestre 2027
- ✓ Durée globale d'exécution : 30 mois de travaux + 5 ans de maintenance (possibilité de 5 ans supplémentaires en tranche optionnelle)

BITCHE (57) - Camp de Bitche/partie camp bâti - CFIM Mise aux normes de la fonction alimentation

Points clés :

- ✓ Classe de coût E = 7 à 10 M€
- ✓ Marché global sectoriel (CCAEM)
- ✓ Procédure restreinte
- ✓ Conduite d'opérations interne

- Surface 2 000 m²
- Capacité 800 rationnaires/service
- Démolition du mess existant et construction du nouvel ensemble



Contact :

BCO Metz – IPMI Delphine GONDRAN, Cheffe de bureau – delphine.gondran@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 2^{ème} semestre 2027
- ✓ Date de notification : 1^{er} semestre 2029
- ✓ Durée globale d'exécution : 1 an de travaux + 3 ans de maintenance

BOURSCHEID (57) - Quartier La Horie - 1 RHC Création du PAF

Points clés :

- ✓ Classe de coûts C = 1 à 3 M €
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Procédure restreinte
- ✓ Maîtrise d'œuvre interne

- Surface 800 m²
- Réaménagement de l'entrée de la base du camp (bâtiment + VRD)
- Démolition du PAF existant et construction du nouvel ensemble



Contact :

BCO Metz – IPMI Delphine GONDRAN, Cheffe de bureau – delphine.gondran@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 2^{ème} semestre 2026
- ✓ Date de notification : 1^{er} semestre 2027
- ✓ Durée globale d'exécution : 10 mois

BOURSCHEID (57) - Quartier La Horie - 1 RHC

Passage plateforme aéro cat 1 - Reprise des voies de circulation

Points clés :

- ✓ Classe de coût E = 7 à 10 M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Procédure ouverte
- ✓ Maîtrise d'œuvre privée

- Surface 25 000 m²
- Réparation de la couche de roulement des chaussées aéronautiques
- Remise aux normes du balisage lumineux.



Contact :

BCO Metz – IPMI Delphine GONDRAN, Cheffe de bureau – delphine.gondran@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : MOP T2 2026 – Travaux 1^{er} semestre 2028
- ✓ Date de notification : MOP T1 2027 - Travaux 1^{er} semestre 2029
- ✓ Durée globale d'exécution : 12 mois

METZ (57) - Caserne Ney Bât 006 - Reprise de la fresque

Points clés :

- ✓ Classe de coûts A = < à 500 k€
- ✓ Procédure ouverte
- ✓ Entreprise de travaux spécialisée
- ✓ Qualification Monuments Historiques
- ✓ Maîtrise d'œuvre privée

- Surface 100 m²
- Rénovation du trophée en haut-relief
- Entreprises ayant la qualification Monuments Historiques



Contact :

BCO Metz – IPMI Delphine GONDRAN, Cheffe de bureau – delphine.gondran@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 2^{ème} semestre 2026
- ✓ Date de notification : 2^{ème} semestre 2027
- ✓ Durée globale d'exécution : 9 mois de travaux

METZ (57) - Cercle rue aux Ours Réfection du clos et du couvert

Points clés :

- ✓ Classe de coût D = 3 à 7 M€
- ✓ Maîtrise d'œuvre privée
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Procédure ouverte

- Surface 22 700 m²
- Réfection des toitures
- Reprise de VRD



Contact :

BCO Metz – IPMI Delphine GONDRAN, Cheffe de bureau – delphine.gondran@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : MOP T3 2026 - Travaux T2 2027
- ✓ Date de notification : MOP 1^{er} semestre 2026 – Travaux 1^{er} semestre 2028
- ✓ Durée globale d'exécution : 12 mois

METZ (57) - Caserne SERE DE RIVIERES Réhabilitation bâtiment hébergement 001

Points clés :

- ✓ Classe de coût D = 3 à 7 M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Procédure ouverte
- ✓ Maîtrise d'œuvre interne

- Surface 6 000 m²
- Capacité 120 lits + bureaux
- Réhabilitation du bâtiment



Contact :

BCO Metz – IPMI Delphine GONDRAN, Cheffe de bureau – delphine.gondran@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 2^{ème} semestre 2026
- ✓ Date de notification : 1^{er} semestre 2027
- ✓ Durée globale d'exécution : 12 mois

METZ (57) - Caserne SERE DE RIVIERES Réhabilitation bâtiment hébergement 006 et 008

Points clés :

- ✓ Classe de coût D = 3 à 7 M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Procédure ouverte
- ✓ Maîtrise d'œuvre interne

- Réhabilitation partielle des bâtiments, prioritairement menuiseries extérieures et rénovation des sanitaires



Contact :

BCO Metz – IPMI Delphine GONDRAN, Cheffe de bureau – delphine.gondran@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 1^{er} semestre 2027
- ✓ Date de notification : 1^{er} semestre 2028
- ✓ Durée globale d'exécution : 24 mois

MONTIGNY LES METZ (57) - Caserne RAFFENEL DELARUE Création d'un bâtiment stockage HCCA

Points clés :

- ✓ Classe de coût D = 3 à 7 M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Procédure ouverte
- ✓ Délégation de maîtrise d'ouvrage

- Surface 2 500 m²
- Capacité 3000 palettes
- Construction d'un nouvel ensemble



Contact :

BCO Metz – IPMI Delphine GONDRAN, Cheffe de bureau – delphine.gondran@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication estimée des offres travaux par le délégataire : 2^{ème} semestre 2027
- ✓ Date de notification : 1^{er} semestre 2028
- ✓ Durée globale d'exécution : 12 mois

CHATILLON (55) - GMU le Rozelier Construction nouveau Poste Protection

Points clés :

- ✓ Classe de coût C = 1 à 3 M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Procédure restreinte
- ✓ Maîtrise d'œuvre interne

- Surface 250 m²
- Construction d'un nouvel ensemble



Contact :

BCO Metz – IPMI Delphine GONDRAN, Cheffe de bureau – delphine.gondran@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 2^{ème} semestre 2026
- ✓ Date de notification : 1^{er} semestre 2027
- ✓ Durée globale d'exécution : 12 mois

CHATILLON (55) - GMU le Rozelier Mise en conformité protection contre la foudre

Points clés :

- ✓ Classe de coût E = 7 à 10 M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Procédure restreinte
- ✓ Maîtrise d'œuvre interne

- Remise aux normes de plus d'une centaine d'ouvrages



Contact :

BCO Metz – IPMI Delphine GONDRAN, Cheffe de bureau – delphine.gondran@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 2^{ème} semestre 2026
- ✓ Date de notification : 1^{er} semestre 2027
- ✓ Durée globale d'exécution : 24 mois

METZ (57) - Caserne De Lattre de Tassigny Reprise des désordres enveloppe, structure et couvert

Points clés :

- ✓ Classe de coûts C = 1 à 3 M €
- ✓ Maîtrise d'œuvre interne
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Procédure ouverte

- Réfection des toitures
- Reprise de la structure et façades
- Reprise des VRD



Contact :

BCO Metz – IPMI Delphine GONDRAN, Cheffe de bureau – delphine.gondran@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : T3 2027
- ✓ Date de notification : T2 2028
- ✓ Durée globale d'exécution : 12 mois

THIONVILLE (57) - Quartier Jeanne d'Arc - 40RTS SCORPION étape 2

Points clés :

- ✓ Classe de coût D = 3 à 7 M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Procédure restreinte
- ✓ Maîtrise d'œuvre interne

- Construction d'une aire de lavage 1 travée
- Réhabilitation de bâtiment
- Réhabilitation d'une travée de la station d'entretien existante
- Construction d'une travée ambidrome NTI 1 en extension



Contact :

BCO Metz – IPMI Delphine GONDRAN, Cheffe de bureau – delphine.gondran@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :


- ✓ Date de publication : T4 2027
- ✓ Date de notification : T4 2028
- ✓ Durée globale d'exécution : 18 mois

WOIPPY (57) - Détachement du 6ème RMA/516RT- Installation de la PFIA (Plateforme inter-armées)

Points clés :

- ✓ Classe de coût E = 7 à 10 M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Procédure ouverte
- ✓ Maîtrise d'œuvre interne

- Réhabilitation de bâtiment (bureaux et stockage) : 2 500m²
- Réhabilitation (hébergement) : 335m²
- Aires aménagées : Stockage, stationnement VL , manœuvre PL,
- Stationnement VL, city stade : 7500m²

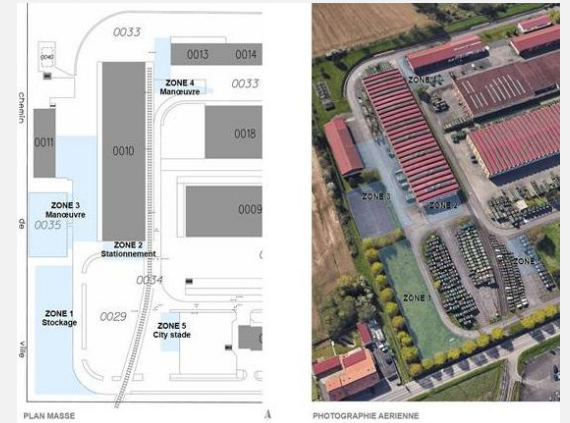

Contact :

BCO Metz – IPMI Delphine GONDRAN, Cheffe de bureau – delphine.gondran@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 2^{ème} semestre 2027
- ✓ Date de notification : T2 2028
- ✓ Durée globale d'exécution : 18 mois

Sous-direction INVESTISSEMENT Bureau de Conduite d'Opérations (BCO) de Nancy

OCHEY (54) – Base aérienne 133

Construction d'un mess

Points clés :

- ✓ Classe de coût G = > à 15 M€
- ✓ Marché global sectoriel (CCAEM)
- ✓ Procédure restreinte
- ✓ Conduite d'opération interne

- Surface 4 000 m²
- Capacité entre 1100 et 1300 rationnaires/jour
- Démolition du mess existant et construction du nouvel ensemble



Contact :

BCO Nancy – Madame Aurélie SAINTÔT, conducteur d'opérations : aurelie.beaucamps@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 2^{ème} trimestre 2026
- ✓ Date de notification : 1^{er} trimestre 2028
- ✓ Durée globale d'exécution : 48 mois (tranche ferme)

LUNEVILLE (54) – 53^{ème} Régiment de Transmissions

Construction d'un ensemble de bâtiment en vue du resserrement du régiment

Points clés :

- ✓ Classe de coût G = > à 15 M€
- ✓ Marché global sectoriel (CCAEM)
- ✓ Procédure restreinte
- ✓ Conduite d'opération interne

- Le projet concerne la construction d'une extension de comprenant 4 bâtiments, des aires de stationnement, de lavage et des abris couverts. Cette extension répond à une nécessité de regrouper l'ensemble du régiment sur un même quartier et à l'accueil des équipements SCORPION.
- Surface à bâtir 5 600 m²
- Aménagements extérieurs et abris couverts



Contact :

BCO Nancy – Madame Emma SCHIAVITTI, conducteur d'opérations : emma.schiavitti@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 3^{ème} trimestre 2026
- ✓ Date de notification : 1^{er} trimestre 2028
- ✓ Durée globale d'exécution : 36 mois

SEMOUTIERS (52) – 61^{ème} Régiment d'Artillerie Construction d'un ensemble de bâtiment pour les équipements SCORPION

Points clés :

- ✓ Classe de coût G = > à 15 M€
- ✓ Marché global sectoriel (CCAEM)
- ✓ Procédure restreinte
- ✓ Conduite d'opération interne

- Le projet concerne la construction d'un ensemble de bâtiments de type ateliers, nécessaires à l'accueil des équipements SCORPION.
- Surface à bâtir ~ 5 000 m²
- Aménagements extérieurs et abris couverts



Contact :

BCO Nancy – Madame Clarisse RUMMEL, conducteur d'opérations : clarisse.rummel@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 1^{ère} trimestre 2027
- ✓ Date de notification : 1^{er} trimestre 2028
- ✓ Durée globale d'exécution : 36 mois

SEMOUTIERS (52) – 61^{ème} Régiment d'Artillerie Rénovation des réseaux AEP et EU

Points clés :

- ✓ Classe de coût D = 3 à 7 M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Marché MOP
- ✓ Procédure restreinte
- ✓ Conduite d'opération interne

- Mise en conformité des réseaux AEP et EU par remplacement des canalisations, regards, etc...
- Installation d'un surpresseur, d'une réserve de 200m³
- Remplacement des caniveaux et regards de piste



Contact :

BCO Nancy – Major David BOYER, conducteur d'opérations : david2.boyer@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication MOP : 1^{er} trimestre 2027
- ✓ Date de notification MOP : 3^{ème} trimestre 2027
- ✓ Durée globale d'exécution : 36 mois
- ✓ Date de publication TRAVAUX : 1^{er} trimestre 2029
- ✓ Date de publication TRAVAUX : 3^{ème} trimestre 2029

EPINAL (88) – Caserne Varaigne - 1^{er} Régiment de Tirailleurs Réhabilitation du bâtiment 03 (Poste de Commandement)

Points clés :

- ✓ Classe de coût D = 3 à 7 M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Marché global sectoriel (CCAEM)
- ✓ Procédure restreinte
- ✓ Conduite d'opération interne

- Mise en conformité du bâtiment
- Rénovation et adaptation des espaces intérieurs
- Isolation Thermique Extérieure



Contact :

BCO Nancy – Madame Emma SCHIAVITTI, conducteur d'opérations : emma.schiavitti@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 1^{er} trimestre 2028
- ✓ Date de notification : 1^{ère} trimestre 2029
- ✓ Durée globale d'exécution : 36 mois

EPINAL (88) – Caserne Varaigne - 1^{er} Régiment de Tirailleurs Réfection des voiries

Points clés :

- ✓ Classe de coût C = 1 à 3 M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Allotissement
- ✓ Procédure ouverte
- ✓ Conduite d'opération et maîtrise d'œuvre interne

- Mise en conformité et réfection globale des voiries de la caserne



Contact :

BCO Nancy – Commandant Magali ROUSSEAU, conducteur d'opérations : magali.rousseau@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 3^{ème} trimestre 2028
- ✓ Date de notification : 1^{ème} trimestre 2029
- ✓ Durée globale d'exécution : 24 mois

SAINT-DIZIER (52) – Base Aérienne 113

Construction d'une armurerie centralisée

Points clés :

- ✓ Classe de coût D = 3 à 7 M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Procédure restreinte
- ✓ Maîtrise d'œuvre interne
- ✓ Conduite d'opération interne

- Surface à bâtir ~ 1 000 m²
- Aménagements extérieurs



Contact :

BCO Nancy – Madame Emma SCHIAVITTI, conducteur d'opérations : emma.schiavitti@intra.def.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 2^{ème} trimestre 2027
- ✓ Date de notification : 1^{er} trimestre 2028
- ✓ Durée globale d'exécution : 18 mois

SAINT-DIZIER (52) – Base Aérienne 113

Construction d'un bâtiment administratif

Points clés :

- ✓ Classe de coût C = 1 à 3 M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Procédure restreinte
- ✓ Maîtrise d'œuvre interne
- ✓ Conduite d'opération interne

- Surface à bâtir ~ 300 m²
- Aménagements extérieurs et parking 25 places



Contact :

BCO Nancy – Madame Clarisse RUMMEL, conducteur d'opérations : clarisse.rummel@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 2^{ème} trimestre 2027
- ✓ Date de notification : 1^{er} trimestre 2028
- ✓ Durée globale d'exécution : 12 mois

SAINT-DIZIER (52) – Base Aérienne 113

Construction d'un bâtiment destiné à un escadron de la base

Points clés :

- ✓ Classe de coût G = > à 15 M€
- ✓ Marché global sectoriel (CCAEM)
- ✓ Procédure restreinte
- ✓ Conduite d'opération interne

- Bâtiment multi-fonctions



Contact :

BCO Nancy – Madame Aurélie SAINTÔT, conducteur d'opérations : aurelie.beaucamps@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : 1^{er} trimestre 2027
- ✓ Date de notification : 1^{er} trimestre 2028
- ✓ Durée globale d'exécution : 24 mois

Sous-direction INVESTISSEMENT Bureau de Conduite d'Opérations (BCO) de Strasbourg

Contact pour toutes les opérations :

Chef BCO Strasbourg – IMI Vincent HAMM – vincent1.hamm@intradef.gouv.fr

NEUBOURG (67) - Gmu Réaménagement entrée et mise en conformité clôture ZP

Points clés :

- ✓ Classe de coûts C = 1 à 3 M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Procédure restreinte (MDS)
- ✓ Conduite d'opération interne/Maîtrise d'œuvre interne

- Surface bâtie 150 m²
- Démolition et reconstruction du Poste d'Accueil et de Filtrage (PAF)
- Surface aménagements extérieurs: 2 000 m²
- Ré-aménagement des voiries

21, 028 et 030



Contact :

BCO Strasbourg – ADC MIRAIL, conducteur d'opérations - vincent.mirail@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :


- ✓ Date de publication : T2/2026 (phase candidatures) ; T3/2026 (phase offres)
- ✓ Date de notification : T4/2026
- ✓ Durée globale d'exécution : 20 mois

HAGUENAU (67) – 54RT/28GG/2RH Constructions et réhabilitations au profit du PI SCORPION

Points clés :

- ✓ Classe de coûts G = sup à 15M€
- ✓ Marché CCAEM (Conception Construction Aménagement Entretien Maintenance)
- ✓ Procédure restreinte
- ✓ Conduite d'opération interne

- Travaux de réhabilitation de hangars
- Travaux de construction :
 - d'extensions à des ateliers et hangars
 - d'une aire de lavage
 - d'une aire de décrottage
 - d'une station d'entretien
 - de parkings
 - d'une extension d'armurerie
 - d'un bâtiment de stockage
- Travaux de mise aux normes ICPE 2930

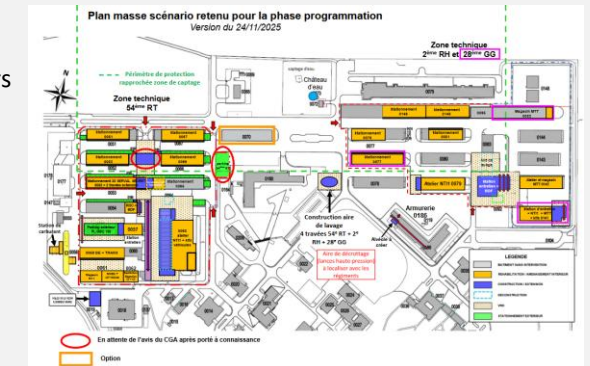

Contact :

BCO Strasbourg – Mme PFLUMIO, conducteur d'opérations – helmina.pflumio@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : T2/2026 (phase candidature) & T4/2026 (phase offre)
- ✓ Date de notification : 3^{ème} trimestre 2027
- ✓ Durée globale d'exécution : 12 mois (conception) – 24 mois (travaux) – 24 mois (maintenance)

COLMAR (68) - Quartier WALTER - 152 RI Réhabilitation bât. 017, 021, 028, 030 - Hébergement EVAT

Points clés :

- ✓ Classe de coûts E = 7 à 10 M€
- ✓ Délégation de maîtrise d'ouvrage
- ✓ Maîtrise d'œuvre privée
- ✓ Allotissement du marché de travaux
- ✓ Procédure ouverte
- ✓ Conduite d'opération externe

- Mise aux normes IOTA de la zone vie (bassins de rétentions, noues)
- Réfection réseau AEP : fiabilisation de la ressource, rénovation du château d'eau, renouvellement du réseau de distribution
- Remplacement des organes du réseau de chaleur



Contact :

Mandataire de la maîtrise d'ouvrage / Louise ARLEN / Cheffe de projets d'EMBASE / louise.arlen@embase.fr (+33 (0)6 71 38 57 39)

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : T3/2026
- ✓ Date de notification : T4/2026
- ✓ Durée globale d'exécution : 79 mois (MOP + TVX + GPA)

GRESSWILLER (67) - 6 RMAT Dossier de régularisation des ICPE – Marché travaux

Points clés :

- ✓ Classe de coûts C = 1 à 3 M€
- ✓ Marché de travaux à tranches
- ✓ Allotissement
- ✓ Procédure ouverte
- ✓ Conduite d'opération interne/Maîtrise d'œuvre interne

TF : mise aux normes structurelles et incendie (ICPE) de la première moitié du bâtiment 0003 et de l'aire 0038 avec création de murs coupe-feu internes et externes

TO : mise aux normes structurelles et incendie de la seconde moitié du bâtiment 003 avec création d'une zone tertiaire et d'une installation de chauffage



Contact :

BCO Strasbourg – Monsieur PERSIGNY, conducteur d'opérations pierre.persigny@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : T2/2026
- ✓ Date de notification : T4/2026
- ✓ Durée globale d'exécution de chaque tranche : 4 mois (PP) + 7 mois (TVX)

MUTZIG (67) - CGE Remplacement de groupes électrogènes

Points clés :

- ✓ Classe de coûts C = 1 à 3M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Allotissement
- ✓ Conduite d'opération interne/Maîtrise d'œuvre interne

- Dépose des groupes existants
- Mise aux normes ICPE 2910+IOTA
- Installation de nouveaux GE



Contact :

BCO Strasbourg – IMI MALLEVAYS, conducteur d'opérations – lucas.malleveys@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : T1/2027
- ✓ Date de notification : T3/2027
- ✓ Durée globale d'exécution : 12 mois

MEYENHEIM (68) - Quartier DIO – RMT

Réfection des réseaux AEP - Marché de maîtrise d'œuvre privée

Points clés :

- ✓ Classe de coûts E = 7 à 10 M€
- ✓ Marché de maîtrise d'œuvre privée
- ✓ Allotissement des travaux
- ✓ Procédure ouverte
- ✓ Conduite d'opération interne

- Mise aux normes IOTA de la zone vie (bassins de rétentions, noues)
- Réfection réseau AEP : fiabilisation de la ressource, rénovation du château d'eau, le renouvellement du réseau de distribution
- Remplacement des organes du réseau de chaleur



Contact :

BCO Strasbourg – Monsieur PERSIGNY, conducteur d'opérations - pierre.persigny@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : T1/2027
- ✓ Date de notification : T3/2027
- ✓ Durée globale d'exécution : 64 mois (Conception + Travaux + GPA)

HAGUENAU (67) - Quartier Estienne - 54 RT/2 RH/28 GG Création d'un poste central de protection

Points clés :

- ✓ Classe de coûts C = 1 à 3 M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Allotissement
- ✓ Procédure restreinte (MDS)
- ✓ Conduite d'opération interne/Maîtrise d'œuvre interne

- Construction d'un poste central de protection (PCP) et des VRD associées.



Contact :

BCO Strasbourg – Monsieur PERSIGNY, conducteur d'opérations - pierre.persigny@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : T1/2027
- ✓ Date de notification : T4/2027
- ✓ Durée globale d'exécution : 26 mois

STRASBOURG (67) – CAPR

Réhabilitation d'un bâtiment bureaux - Marché de maîtrise d'œuvre privée

Points clés :

- ✓ Classe de coûts G = sup à 15 M€
- ✓ Marché de maîtrise d'œuvre privée
- ✓ Allotissement des travaux
- ✓ Procédure restreinte
- ✓ Conduite d'opération interne

- Réhabilitation d'un bâtiment à usage de bureaux d'une surface de 8000m²
- (rez-de-chaussée, trois étages courants et un étage sous comble).
- Mise aux normes incendie
- Renforcement SECPRO (cages à faraday)

21, 028 et 030



Contact :

BCO Strasbourg – Madame RIETSCH, conducteur d'opérations - dorothee.rietsch@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :


- ✓ Date de publication : T1/2027
- ✓ Date de notification : T3/2027
- ✓ Durée globale d'exécution : 48 mois (CONCEPTION + TVX + GPA)

HAGUENAU (67) – 54RT/28GG/2RH Constructions et réhabilitations au profit du PI SCORPION – Marché TRAVAUX

Points clés :

- ✓ Classe de coûts C = 1 à 3 M€
- ✓ Marché TRAVAUX
- ✓ Maîtrise d'œuvre interne (BMO METZ)
- ✓ Conduite d'opération interne

- Réhabilitation d'un hangar : 14 travées double stationnement
- Création d'une extension entre deux hangars
- Aménagement d'un bâtiment : 3 travées doubles
- Sécurisation SECPRO
- Un parking

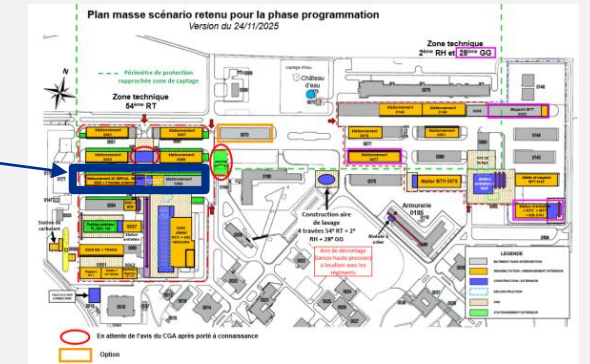

Contact :

BCO Strasbourg – Mme PFLUMIO, conducteur d'opérations – helmina.pflumio@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : T3/2027
- ✓ Date de notification : T4/2027
- ✓ Durée globale d'exécution : 10 mois (TF)

COLMAR (68) - 152RI - Quartiers WALTER et BRUAT Réfection des VRD - Marché de maîtrise d'œuvre privée

Points clés :

- ✓ Classe de coûts C = 1 à 3 M€
- ✓ Marché de maîtrise d'œuvre privée
- ✓ Allotissement des travaux
- ✓ Procédure ouverte
- ✓ Conduite d'opération interne

21, 028 et 030

- Réfection des VRD et réseau AEP

Contact :

BCO Strasbourg – Monsieur MERLEVEDE, conducteur d'opérations - pierre-simon.merlevede@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : T3/2027
- ✓ Date de notification : T4/2027
- ✓ Durée globale d'exécution : 36 mois (TVX + GPA)

STRASBOURG (67) - Caserne STIRN – GSC

Remplacement de l'ensemble de cuisson et adaptation du SRHL - Cuisines provisoires

Points clés :

- ✓ Classe de coûts C = 1 à 3 M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Allotissement
- ✓ Procédure ouverte
- ✓ Conduite d'opération interne/Maîtrise d'œuvre interne

- Capacité de 400 rationnaires le midi
- Location de cuisines modulaires

21, 028 et 030



Contact :

BCO Strasbourg – Monsieur CAGNON, conducteur d'opérations - valentin.cagnon@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : T3/2027
- ✓ Date de notification : T4/2027
- ✓ Durée globale d'exécution : 24 mois (TVX + durée de location)

STRASBOURG (67) - Caserne STIRN – GSC

Remplacement de l'ensemble de cuisson et adaptation du SRHL – Réhabilitation du bâtiment 002

Points clés :

- ✓ Classe de coûts C = 1 à 3 M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Allotissement
- ✓ Procédure ouverte
- ✓ Conduite d'opération interne/Maîtrise d'œuvre interne

- Surface 3800 m²
- Capacité de 700 rationnaires le midi
- Rénovation du bâtiment existant avec mise aux normes incendie, rétablissement des mesures sanitaires, amélioration de la ventilation et de la performance énergétique

21, 028 et 030



Contact :

BCO Strasbourg – Monsieur CAGNON, conducteur d'opérations - valentin.cagnon@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : T4/2027
- ✓ Date de notification : T1/2028
- ✓ Durée globale d'exécution : 13 mois

ILLKIRCH (67) – 291^{ème} Jägerbataillon Construction d'un hangar de maintenance HIL et d'un bâtiment transmission

Points clés :

- ✓ Classe de coûts G : sup à 15M€
- ✓ Marché CCAEM (Conception Construction Aménagement Entretien Maintenance)
- ✓ Procédure restreinte
- ✓ Conduite d'opération interne

- Construction d'un hangar de maintenance – HIL
- Construction d'un bâtiment d'instruction spécifique pour la section transmissions du bataillon, destiné à la formation et à l'entraînement sur le système d'information et de commandement de l'armée de Terre allemande (FIS-H).



Contact :

BCO Strasbourg – Monsieur CAGNON, conducteur d'opérations - valentin.cagnon@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : T3/2027 (phase candidature) & T4/2027 (phase offre)
- ✓ Date de notification : T3/2028
- ✓ Durée globale d'exécution : 12 mois (conception) – 12 mois (travaux) – 24 mois (maintenance)

STRASBOURG (67) – Caserne TURENNE

Réhabilitation d'un bâtiment en hébergement - Marché de maîtrise d'œuvre privée

Points clés :

- ✓ Classe de coûts D = 3 à 7 M€
- ✓ Marché de maîtrise d'œuvre privée
- ✓ Allotissement des travaux
- ✓ Procédure restreinte
- ✓ Conduite d'opération interne

- Réhabilitation d'un bâtiment hébergement
- Mise aux normes incendie
- Création d'un parking

21, 02



Contact :

BCO Strasbourg – Madame RIETSCH, conducteur d'opérations - dorothee.rietsch@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : T4/2027
- ✓ Date de notification : T2/2028
- ✓ Durée globale d'exécution : 36 mois (CONCEPTION + TVX + GPA)

NEUBOURG (67) - Gmu Réhabilitation légère chenil et bâtiment cynotechnique

Points clés :

- ✓ Classe de coûts C = 1 à 3M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Allotissement
- ✓ Conduite d'opération interne/Maîtrise d'œuvre interne

- Construction de 14 courettes
- Construction d'un bâtiment cynotechnique
- Construction d'un parc
- Réhabilitation des bâtiments existants



Contact :

BCO Strasbourg – ASC2 AOUDACHE, conducteur d'opérations - pauline.aoudache@intradef.gouv.fr

Maîtrise d'œuvre : BMO METZ : marc.schirar@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : T2/2028
- ✓ Date de notification : T4/2028
- ✓ Durée globale d'exécution : 10 mois

HAGUENAU (67) - Quartier Estienne Rénovation des VRD - Marché de maîtrise d'œuvre privée

Points clés :

- ✓ Classe de coûts F = 10 à 15 M€
- ✓ Marché de maîtrise d'œuvre privée
- ✓ Allotissement des travaux
- ✓ Procédure ouverte
- ✓ Conduite d'opération interne

- Réfection des réseaux d'adduction d'eau, d'électricité, de chauffage, d'EU et d'EP et de toutes les voiries dégradées au sein de l'emprise.

21, 028 e



Contact :

BCO Strasbourg – Monsieur MERLEVEDE, conducteur d'opérations - pierre-simon.merlevede@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : T3/2028
- ✓ Date de notification : T4/2028
- ✓ Durée globale d'exécution : 51 mois (TVX + GPA)

HAGUENAU (68) - Quartier ESTIENNE – 54RT/28GG/2RH Réhabilitation et mise aux normes VIVIEN – Mandat de maîtrise d’ouvrage

Points clés :

- ✓ Classe de coûts D = 3 à 7 M€
- ✓ Marché de Mandat de Maîtrise d’Ouvrage
- ✓ Procédure restreinte

- Mise aux normes et réhabilitation d’un bâtiment hébergement

Contact :

BCO Strasbourg – Monsieur MERLEVEDE, conducteur d’opérations - pierre-simon.merlevede@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : T4/2028
- ✓ Date de notification : T2/2029
- ✓ Durée globale d’exécution : 36 mois

MUTZIG (67) - Gmu Construction d'un chenil

Points clés :

- ✓ Classe de coûts C = 1 à 3M€
- ✓ Marché de travaux
- ✓ Allotissement
- ✓ Conduite d'opération interne/Maîtrise d'œuvre interne

- construction d'un nouveau chenil de 10 courettes (dont 1 d'isolement)



Contact :

BCO Strasbourg – IMI MALLEVAYS, conducteur d'opérations – lucas.malleveys@intradef.gouv.fr

Maîtrise d'œuvre : BMO METZ : marc.schirar@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : T2/2029
- ✓ Date de notification : T3/2029
- ✓ Durée globale d'exécution : 10 mois

HAGUENAU (67) - Quartier ESTIENNE – 54RT/28GG/2RH Rénovation d'un BCC – Mandat de maîtrise d'ouvrage

Points clés :

- ✓ Classe de coûts D = 3 à 7 M€
- ✓ Marché de Mandat de Maîtrise d'Ouvrage
- ✓ Procédure restreinte

- Mise aux normes et réhabilitation d'un bâtiment hébergement

Contact :

BCO Strasbourg – Monsieur MERLEVEDE, conducteur d'opérations - pierre-simon.merlevede@intradef.gouv.fr

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Date de publication : T4/2029
- ✓ Date de notification : T2/2030
- ✓ Durée globale d'exécution : 36 mois

Division projet RAFALE-CANADA



RAFALE-CANADA

BASES DE DEFENSE DE LA ZONE NORD-EST



SAINT-DIZIER (52) : Base aérienne 113



OP reprise par CND / DANZ NE via ITNI.
Le SID a en charge le report COSI

SAINT-DIZIER (52) – Base aérienne 113

Vidéo-protection sur l'ensemble de la base – Part infra

453579

Points clés :

- ✓ Classe de coût B : de 500 k€ à 1 M€ ;
- ✓ Marché de travaux;
- ✓ Marché de défense et de sécurité → procédure restreinte ;
- ✓ Conduite d'opérations interne ;
- ✓ Maîtrise d'œuvre interne.

Prérequis pour déploiement réseaux CND :

- > 4 km de tranchées ;
- Installation de fourreaux ;
- Massifs béton ;
- Coffrets électriques en attente.

Contact :

Chef du PCO CANADA : Benoît Marcuzzi (benoit.marcuzzi@intradef.gouv.fr)

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Appel à candidature : T3_2025 / Offres : T1_2026 ;
- ✓ Date de notification envisagée : T2_2026 ;
- ✓ Durée globale d'exécution : 14 mois (dont 4 de PP) avec début des travaux envisagé au T3_2026.

SAINT-DIZIER (52) – Base aérienne 113 Réaménagement de l'entrée de la base

442425

Points clés :

- ✓ Classe de coût D : de 3 à 7 M€ ;
- ✓ Marché de travaux ;
- ✓ Procédure ouverte ;
- ✓ Conduite d'opérations interne ;
- ✓ Maîtrise d'œuvre interne.

Opérations en 4 phases (déconstructions, ouvrages provisoires, etc.) ;

Surface à construire : 530 m² ;

Allotissement : **Gros-œuvre étendu**, VRD, désamiantage/déconstruction.

Contact :

Chef du PCO CANADA : Benoît Marcuzzi (benoit.marcuzzi@intradef.gouv.fr)

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Appel d'offres : T4_2025 ;
- ✓ Date de notification envisagée : T2_2026 ;
- ✓ Durée globale d'exécution : 36 mois (dont 4 de PP) avec début des travaux envisagé au T3_2026.

SAINT-DIZIER (52) – Base aérienne 113

Accueil de l'EETIS (ensemble d'équipe technique et d'instruction spécialisée)

467351

Points clés :

- ✓ Classe de coût C : de 1 à 3 M€ ;
- ✓ Marché de travaux ;
- ✓ Marché de défense et de sécurité → procédure restreinte ;
- ✓ Conduite d'opérations interne ;
- ✓ Maîtrise d'œuvre interne.

Construction d'un bâtiment comprenant des bureaux, des salles de cours, vestiaires, sanitaires et salle de repos ;

Voiries et parking de 30 places à créer ;

Allotissement : VRD, TCE et ITE-peintures.

Contact :

Chef du PCO CANADA : Benoît Marcuzzi (benoit.marcuzzi@intradef.gouv.fr)

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Appel à candidature : T4_2025 / Offres : T2_2026 ;
- ✓ Date de notification envisagée : T4_2026 ;
- ✓ Durée globale d'exécution : 15 mois (dont 3 de PP) avec début des travaux envisagé au **T1_2027**.

SAINT-DIZIER (52) – Base aérienne 113
Construction d'un bâtiment administratif pour le SEO
447857

Points clés :

- ✓ Classe de coût C : de 1 à 3 M€ ;
- ✓ Marché de travaux ;
- ✓ Procédure ouverte ;
- ✓ Conduite d'opérations interne ;
- ✓ Maîtrise d'œuvre interne.

Mise en place de bungalows puis démolition du bâtiment existant ;

Construction d'un bâtiment comprenant des bureaux, des salles de cours, vestiaires, sanitaires et salle de repos ;

Parking de 25 places à créer ;

Allotissement : désamiantage/démolition, VRD et TCE.

Contact :

Chef du PCO CANADA : Benoît Marcuzzi (benoit.marcuzzi@intradef.gouv.fr)

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Appel d'offres : T4_2027 ;
- ✓ Date de notification envisagée : T1_2028 ;
- ✓ Durée globale d'exécution : 23 mois (dont 3 de PP) avec début des travaux envisagé au T2_2028.

RAFALE-CANADA

BASES DE DEFENSE DE LA ZONE NORD-EST



LUXEUIL-LES-BAINS (70) : Base aérienne 116



LUXEUIL-LES-BAINS (70) – Base aérienne 116

Adaptation des infrastructures pour l'accueil des escadrons RAF 7 et RAF 8 – Prestations intellectuelles

441906

Points clés :

- ✓ Classe de coût A à B : jusqu'à 1M€ ;
- ✓ Marché de prestations intellectuelles ;
- ✓ Conduite d'opérations interne.

Multitude de prestations :

- Études de sol ;
- Relevés topo ;
- Études géomorphologiques ;
- Études de sites et sols pollués ;
- SPS 1^{er} niveau ;
- Contrôle technique ;
- AMO cybersécurité ;
- Diagnostics amiante/plomb ;
- Etude de sol ;
- ...

Contact :

Chef du PCO RAFALE : Marc Escudie (marc.escudie@intradef.gouv.fr)

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Dates de publication : tout au long de l'année ;
- ✓ Durée globale d'exécution : dès maintenant et jusqu'à ... 2038.

LUXEUIL-LES-BAINS (70) – Base aérienne 116

Adaptation des infrastructures pour l'accueil des escadrons RAF 7 et RAF 8 – Travaux

463094

Points clés :

- ✓ Classe de coût G: >> 15 M€ ;
- ✓ Marché de CCAEM ;
- ✓ Marché de défense et de sécurité → procédure restreinte ;
- ✓ Conduite d'opérations interne.

Conception-Construction-Aménagement-Entretien-Maintenance comprenant :

- Construction de bâtiments tertiaires ;
- Construction de hangars de maintenance des avions ;
- Construction de hangars de stockage ;
- Construction d'aires et de voiries aéronautiques (> 300 000 m²).

Contact :

Chef du PCO RAFALE : Marc Escudie (marc.escudie@intradef.gouv.fr)

Calendrier prévisionnel :

- ✓ Appel à candidatures : début avril 2026 / Offres : octobre 2026 ;
- ✓ Date de notification envisagée : 2028 ;
- ✓ Durée globale d'exécution : 10 ans (jusqu'en 2038) hors partie maintenance.

Présentation des « lignes de produits » - SID EPN

_v20260127

1) PRÉSENTATION DES LIGNES DE PRODUIT


2) DOCUMENTS ANNEXES

Calendrier prévisionnel de notification des accords cadres nationaux majeurs (> 100 M€)


Libellé court	Objet détaillé de l'AC	Date publication	Date notification prévisionnelle	Durée (mois)
AC HBGT 3	Réalisation de bâtiments d'hébergement relevant du ministère des armées et des anciens combattants - CCAEM	01/04/26	16/09/27	48
AC hangars SCORPION	Réalisation d'infrastructures d'entretien et de remisage de véhicules, notamment SCORPION - CCAEM	12/01/26	09/09/27	84
AC hangars HIL	Réalisation d'infrastructures d'entretien et de remisage d'aéronefs, notamment H160M (HIL) - CCAEM	17/01/26	18/09/27	84
AC EAL	Réalisation d'infrastructures de restauration collective, notamment les ensembles alimentation loisirs (EAL) - CCAEM	15/04/26	27/01/28	48
AC Achat SMI	Acquisition de structures modulaires industrialisées au profit du ministère des Armées relevant du périmètre des SID Sud et Méditerranée	15/04/26	01/02/27	48
AC HMPS	Accord-cadre d'acquisition et de mise en œuvre de hangars métalliques polyvalents standardisés et accessoires partout dans le monde	30/04/26	01/03/27	48

Calendrier prévisionnel de notification des accords cadres nationaux majeurs (< 100 M€)

Libellé court	Objet détaillé de l'AC	Date publication	Date notification prévisionnelle	Durée (mois)
AC Location SMI	Location de structures modulaires industrialisées au profit du ministère des Armées relevant du périmètre du SID	15/04/26	01/02/27	48
AC EAU OPEX (BC+MS)	Fourniture, fabrication, montage et mise en route d'installations relatives à la chaîne de l'eau opérationnelle, partout dans le monde	06/04/26	01/01/27	48
AC Achat SMI 150 m²	Acquisition de bungalows pour une superficie <150m ² au profit du ministère des Armées relevant du périmètre des SID-R	15/04/26	01/02/27	48
AC TVX ITE	Maintien en condition opérationnelle des Installations Terminales Embranchées à destination des SID régionaux (SID-R)	04/07/26	01/03/27	48
AC EDPM	AC Fourniture de granulat de type EDPM au profit des stands de tir du ministère des Armées	06/07/26	01/07/27	48
EHTPP	Prestations recherche doc., consult. archives, visites sites et synthèse pour réalisation études historiques et techniques de pollutions pyrotechniques	04/10/26	01/06/27	48
EEO AERO	Etudes d'évaluation d'obstacles au profit des bases aériennes	01/12/26	01/12/27	48
AC AMO EAL	AMO de réalisation d'EIF, de rédaction de programmes et d'assistance à la rédaction de pièces de marchés subséquents	07/05/26	01/06/27	24

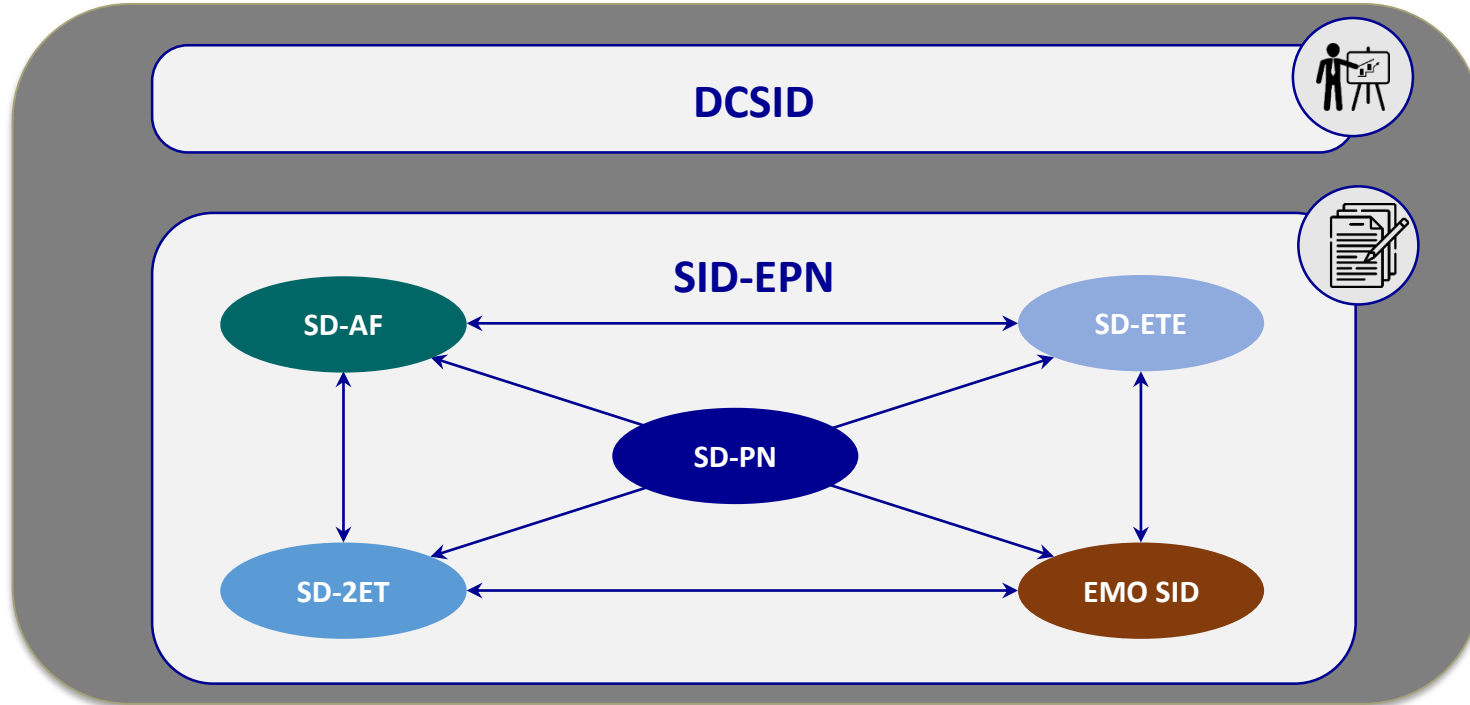

*Un SID uni
=
une DCSID forte,
qui pilote et oriente
+
un SID-EPN,
qui participe directement à la
production du SID*

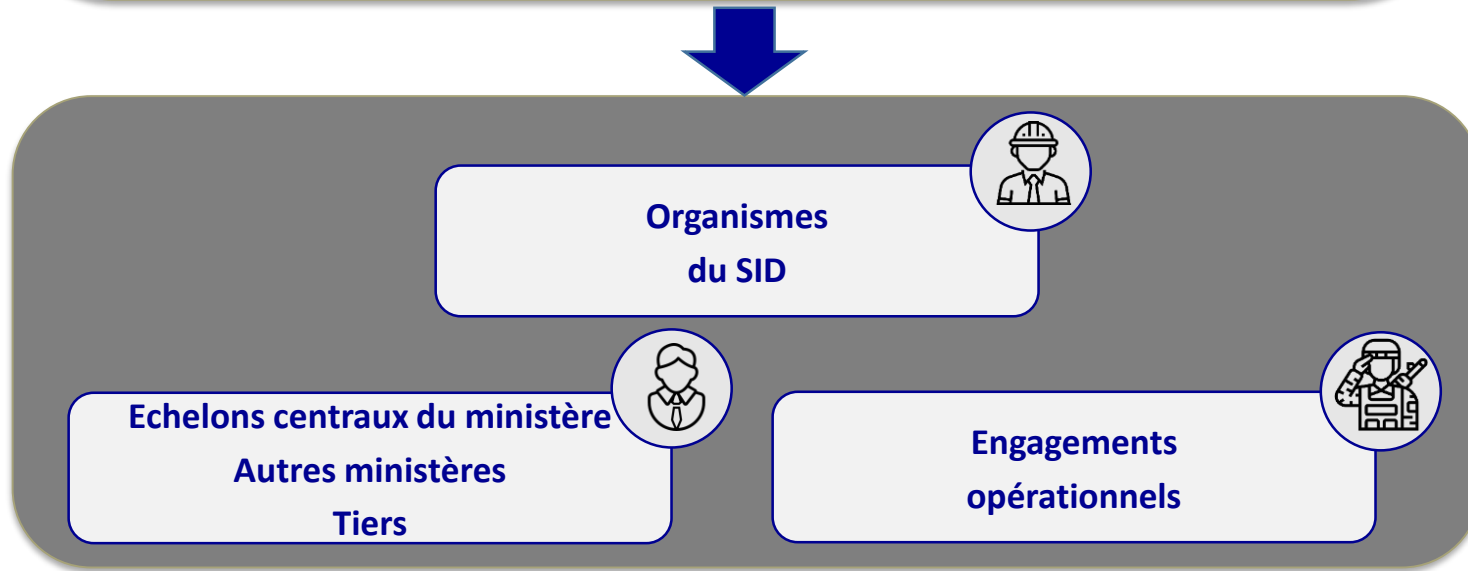



Le concept des « lignes de produit »

Le **caractère récurrent** de certains « projets nationaux » incite à la création de « lignes de produits »

Coûts – Performance – Délais

Standardisation



Assister les bénéficiaires dans
l'expression d'un besoin générique


**Apporter
une réponse technique homogène**

Supports techniques
(guides, plaquettes, ...)

Programmes techniques fonctionnels

Supports contractuels
(clausiers, CCTP, ...)

Massification (« Industrialisation »)



Participer à la définition
d'une stratégie d'achat


**Passer, contractualiser
et exécuter des contrats**

Outils contractuels
(accords-cadres, ...)



Les différentes étapes d'un « projet national » d'industrialisation

Un compromis
entre « fire and forget » et « full SID-EPN »

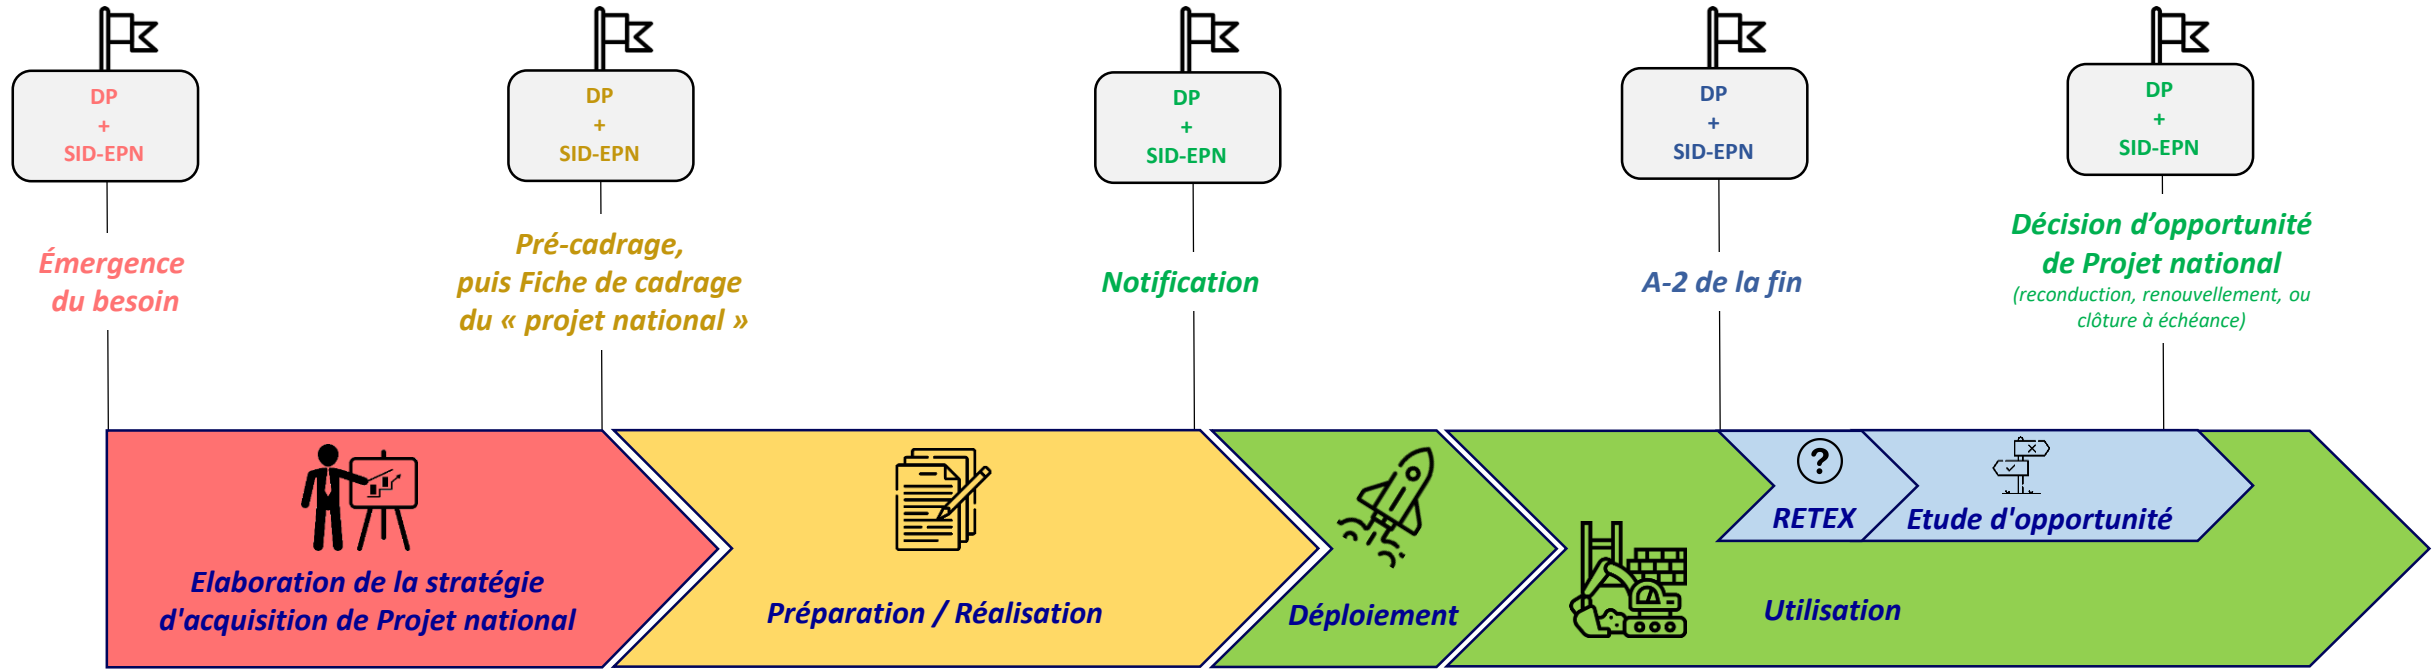



L'ambition de réponse au besoin d'un « projet national » d'industrialisation

**Une réponse
« all inclusive »**



Impératifs DCSID et partenaires

(coûts, délais, performance, ligne de produit, ...)

+ contraintes d'intégration au site

(PLU, zone MH, contraintes environnementales, contraintes ICPE/IOTA, ...)

+ contraintes d'adaptation au site

(nature du sol, configuration et puissance des fluides, ...)

+ mobilier, équipements, ...

(suivant spécifications)

